LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan : Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian : 20 April 2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender
(20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 1 (KE SATU)
Periode :
20 April 2026
s/d
26 April 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	1.000	0.003	100.00	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	-	-	-	10.000	0.003	20.00	10.000	0.003	20.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	-	-	-	10.000	0.007	66.67	10.000	0.007	66.67
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	-	-	-	10.000	0.002	66.67	10.000	0.002	66.67
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	-	-	-	0.029	0.001	0.37	0.029	0.001	0.37
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	-	-	-	20.000	0.001	40.00	20.000	0.001	40.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				87,385,637.84		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	PEKERJAAN PERSIAPAN						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	-	-	-	15.000	0.005	2.60	15.000	0.005	2.60
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	-	-	-	0.300	0.099	30.00	0.300	0.099	30.00
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Perunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH B PEKERJAAN PERSIAPAN	**349,293,707.80**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	**PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Galian Tanah Pondasi Setempat (Manual)	M3	403.27	85,000.00	34,277,950.00	0.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah Sloof (Manual)	M3	155.10	85,000.00	13,183,500.00	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengurugan Kembali Galian Tanah	M3	264.25	55,000.00	14,533,750.00	0.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengurugan Tanah Urug (Tanah Dari Luar)	M3	5,042.83	150,000.00	756,424,500.00	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penghamparan, Perataan dan Pemadatan Tanah CBR Min 6 %	M3	5,042.83	50,000.00	252,141,500.00	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir Alas Pondasi, t = 10 cm	M3	13.62	300,510.00	4,092,946.20	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urugan Pasir Alas Sloof, t = 10 cm	M3	13.96	300,510.00	4,195,119.60	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lantai Kerja, K-100, Alas Pondasi, t = 5 cm	M3	27.25	850,000.00	23,162,500.00	0.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lantai Kerja, K-100, Alas Sloof, t = 5 cm	M3	27.91	850,000.00	23,723,500.00	0.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lantai Kerja, K-100, Alas Plat Lantai, t = 5 cm	M3	91.89	850,000.00	78,106,500.00	0.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Galian Tanah Pondasi Batu Belah	M3	199.63	85,000.00	16,968,550.00	0.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pemasangan Pondasi Batu Belah Type N (5,2 Mpa) Campuran 1SP : 4PP	M3	112.52	800,000.00	90,016,000.00	0.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping) Untuk Pondasi Gedung	M3	27.54	559,597.00	15,411,301.38	0.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pondasi (FPK-1) Uk. 200 x 200 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	38.40	1,280,000.00	49,152,000.00	0.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	4,215.82	15,000.00	63,237,300.00	0.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	76.80	130,000.00	9,984,000.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pondasi (FPK-2) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	9.50	1,280,000.00	12,160,000.00	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,494.11	15,000.00	22,411,650.00	0.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	31.68	130,000.00	4,118,400.00	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pondasi (FPK-3) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	7.78	1,280,000.00	9,958,400.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,222.46	15,000.00	18,336,900.00	0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	25.92	130,000.00	3,369,600.00	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kolom Pedestal-1, Uk. 40 x 80 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	23.55	1,280,000.00	30,144,000.00	0.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	3,181.73	16,500.00	52,498,545.00	0.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	899.60	15,750.00	14,168,700.00	0.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	176.64	185,000.00	32,678,400.00	0.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kolom Pedestal-2, Uk. 30 x 60 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	13.66	1,280,000.00	17,484,800.00	0.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	1,770.79	16,500.00	29,218,035.00	0.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	683.58	15,750.00	10,766,385.00	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	136.62	185,000.00	25,274,700.00	0.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kolom Pedestal-3, Uk. 30 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	5.59	1,280,000.00	7,155,200.00	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	1,738.59	16,500.00	28,686,735.00	0.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	359.54	15,750.00	5,662,755.00	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	74.52	185,000.00	13,786,200.00	0.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sloof (S1), Uk. 25 x 30 cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	100.62	1,280,000.00	128,793,600.00	0.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan : Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian : 20 April 2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender
(20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 2 (KE DUA)
Periode :
27 April 2026
s/d
03 Mei 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	1.000	0.001	50.00	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	10.000	0.003	20.00	-	-	-	10.000	0.003	20.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	10.000	0.007	66.67	-	-	-	10.000	0.007	66.67
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	10.000	0.002	66.67	-	-	-	10.000	0.002	66.67
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.029	0.001	0.37	0.029	0.001	0.37	0.059	0.002	0.74
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	-	-	-	0.058	0.000	5.83	0.058	0.000	5.83
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	20.000	0.001	40.00	-	-	-	20.000	0.001	40.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	-	-	-	0.106	0.005	1.33	0.106	0.005	1.33
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	15.000	0.005	2.60	-	-	-	15.000	0.005	2.60
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	-	-	-	2,094.000	0.138	31.83	2,094.000	0.138	31.83
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.300	0.099	30.00	-	-	-	0.300	0.099	30.00
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Perunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH B PEKERJAAN PERSIAPAN			**349,293,707.80**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	**PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Galian Tanah Pondasi Setempat (Manual)	M3	403.27	85,000.00	34,277,950.00	0.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah Sloof (Manual)	M3	155.10	85,000.00	13,183,500.00	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengurugan Kembali Galian Tanah	M3	264.25	55,000.00	14,533,750.00	0.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengurugan Tanah Urug (Tanah Dari Luar)	M3	5,042.83	150,000.00	756,424,500.00	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penghamparan, Perataan dan Pemadatan Tanah CBR Min 6 %	M3	5,042.83	50,000.00	252,141,500.00	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir Alas Pondasi, t = 10 cm	M3	13.62	300,510.00	4,092,946.20	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urugan Pasir Alas Sloof, t = 10 cm	M3	13.96	300,510.00	4,195,119.60	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lantai Kerja, K-100, Alas Pondasi, t = 5 cm	M3	27.25	850,000.00	23,162,500.00	0.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lantai Kerja, K-100, Alas Sloof, t = 5 cm	M3	27.91	850,000.00	23,723,500.00	0.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lantai Kerja, K-100, Alas Plat Lantai, t = 5 cm	M3	91.89	850,000.00	78,106,500.00	0.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Galian Tanah Pondasi Batu Belah	M3	199.63	85,000.00	16,968,550.00	0.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pemasangan Pondasi Batu Belah Type N (5,2 Mpa) Campuran 1SP : 4PP	M3	112.52	800,000.00	90,016,000.00	0.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping) Untuk Pondasi Gedung	M3	27.54	559,597.00	15,411,301.38	0.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pondasi (FPK-1) Uk. 200 x 200 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	38.40	1,280,000.00	49,152,000.00	0.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	4,215.82	15,000.00	63,237,300.00	0.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	76.80	130,000.00	9,984,000.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pondasi (FPK-2) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	9.50	1,280,000.00	12,160,000.00	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,494.11	15,000.00	22,411,650.00	0.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	31.68	130,000.00	4,118,400.00	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pondasi (FPK-3) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	7.78	1,280,000.00	9,958,400.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,222.46	15,000.00	18,336,900.00	0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	25.92	130,000.00	3,369,600.00	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kolom Pedestal-1, Uk. 40 x 80 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	23.55	1,280,000.00	30,144,000.00	0.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	3,181.73	16,500.00	52,498,545.00	0.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	899.60	15,750.00	14,168,700.00	0.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	176.64	185,000.00	32,678,400.00	0.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kolom Pedestal-2, Uk. 30 x 60 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	13.66	1,280,000.00	17,484,800.00	0.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	1,770.79	16,500.00	29,218,035.00	0.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	683.58	15,750.00	10,766,385.00	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	136.62	185,000.00	25,274,700.00	0.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kolom Pedestal-3, Uk. 30 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	5.59	1,280,000.00	7,155,200.00	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	1,738.59	16,500.00	28,686,735.00	0.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	359.54	15,750.00	5,662,755.00	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	74.52	185,000.00	13,786,200.00	0.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sloof (S1), Uk. 25 x 30 cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	100.62	1,280,000.00	128,793,600.00	0.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan : Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian : 20 April 2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender
(20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 3 (KE TIGA)
Periode :
04 Mei 2026
s/d
10 Mei 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	10.000	0.003	20.00	11.000	0.003	22.00	21.000	0.006	42.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	-	-	-	10.000	0.001	20.00	10.000	0.001	20.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	10.000	0.007	66.67	1.000	0.001	6.67	11.000	0.007	73.33
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	-	-	-	10.000	0.010	20.00	10.000	0.010	20.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	10.000	0.002	66.67	5.000	0.001	33.33	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	-	-	-	1.000	0.113	100.00	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	-	-	-	1.000	0.013	100.00	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.059	0.002	0.74	0.029	0.001	0.37	0.088	0.002	1.10
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	-	-	-	0.125	0.001	12.50	0.125	0.001	12.50
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.058	0.000	5.83	-	-	-	0.058	0.000	5.83
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	20.000	0.001	40.00	1.000	0.000	2.00	21.000	0.001	42.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	-	-	-	2.000	0.020	100.00	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				87,385,637.84		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	PEKERJAAN PERSIAPAN						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	-	-	-	1.000	0.004	100.00	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.106	0.005	1.33	0.019	0.001	0.23	0.125	0.005	1.56
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	0.125	0.004	1.56	0.125	0.004	1.56
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	-	-	-	0.125	0.002	1.56	0.125	0.002	1.56
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	-	-	-	1.000	0.066	100.00	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	15.000	0.005	2.60	181.000	0.066	31.37	196.000	0.071	33.97
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	2,094.000	0.138	31.83	-	-	-	2,094.000	0.138	31.83
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.300	0.099	30.00	-	-	-	0.300	0.099	30.00
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH B PEKERJAAN PERSIAPAN			**349,293,707.80**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	**PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Galian Tanah Pondasi Setempat (Manual)	M3	403.27	85,000.00	34,277,950.00	0.226	-	-	-	240.328	0.134	59.59	240.328	0.134	59.59
2	Galian Tanah Sloof (Manual)	M3	155.10	85,000.00	13,183,500.00	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengurugan Kembali Galian Tanah	M3	264.25	55,000.00	14,533,750.00	0.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengurugan Tanah Urug (Tanah Dari Luar)	M3	5,042.83	150,000.00	756,424,500.00	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penghamparan, Perataan dan Pemadatan Tanah CBR Min 6 %	M3	5,042.83	50,000.00	252,141,500.00	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir Alas Pondasi, t = 10 cm	M3	13.62	300,510.00	4,092,946.20	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urugan Pasir Alas Sloof, t = 10 cm	M3	13.96	300,510.00	4,195,119.60	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lantai Kerja, K-100, Alas Pondasi, t = 5 cm	M3	27.25	850,000.00	23,162,500.00	0.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lantai Kerja, K-100, Alas Sloof, t = 5 cm	M3	27.91	850,000.00	23,723,500.00	0.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lantai Kerja, K-100, Alas Plat Lantai, t = 5 cm	M3	91.89	850,000.00	78,106,500.00	0.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Galian Tanah Pondasi Batu Belah	M3	199.63	85,000.00	16,968,550.00	0.112	-	-	-	17.928	0.010	8.98	17.928	0.010	8.98
12	Pemasangan Pondasi Batu Belah Type N (5,2 Mpa) Campuran 1SP : 4PP	M3	112.52	800,000.00	90,016,000.00	0.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping) Untuk Pondasi Gedung	M3	27.54	559,597.00	15,411,301.38	0.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pondasi (FPK-1) Uk. 200 x 200 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	38.40	1,280,000.00	49,152,000.00	0.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	4,215.82	15,000.00	63,237,300.00	0.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	76.80	130,000.00	9,984,000.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pondasi (FPK-2) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	9.50	1,280,000.00	12,160,000.00	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,494.11	15,000.00	22,411,650.00	0.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	31.68	130,000.00	4,118,400.00	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pondasi (FPK-3) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	7.78	1,280,000.00	9,958,400.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,222.46	15,000.00	18,336,900.00	0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	25.92	130,000.00	3,369,600.00	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kolom Pedestal-1, Uk. 40 x 80 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	23.55	1,280,000.00	30,144,000.00	0.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	3,181.73	16,500.00	52,498,545.00	0.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	899.60	15,750.00	14,168,700.00	0.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	176.64	185,000.00	32,678,400.00	0.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kolom Pedestal-2, Uk. 30 x 60 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	13.66	1,280,000.00	17,484,800.00	0.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	1,770.79	16,500.00	29,218,035.00	0.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	683.58	15,750.00	10,766,385.00	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	136.62	185,000.00	25,274,700.00	0.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kolom Pedestal-3, Uk. 30 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	5.59	1,280,000.00	7,155,200.00	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. >12mm, Cara Semi Mekanis	Kg	1,738.59	16,500.00	28,686,735.00	0.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pembesian Penulangan Kolom, Balok, Ring balk dan Sloof Untuk BjTS Dia. <12mm, Cara Manual	Kg	359.54	15,750.00	5,662,755.00	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Pemasangan Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	M2	74.52	185,000.00	13,786,200.00	0.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sloof (S1), Uk. 25 x 30 cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	100.62	1,280,000.00	128,793,600.00	0.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender (20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 4 (KE EMPAT)
Periode :
11 Mei 2026
s/d
17 Mei 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	-	-	-	0.125	0.001	12.50	0.125	0.001	12.50
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	-	-	-	0.125	0.001	12.50	0.125	0.001	12.50
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	0.125	0.000	12.50	0.125	0.000	12.50
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	0.125	0.000	12.50	0.125	0.000	12.50
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	-	-	-	1.000	0.001	100.00	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	-	-	-	1.000	0.001	20.00	1.000	0.001	20.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	21.000	0.006	42.00	29.000	0.008	58.00	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	10.000	0.001	20.00	40.000	0.003	80.00	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	11.000	0.007	73.33	4.000	0.003	26.67	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	10.000	0.010	20.00	40.000	0.039	80.00	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.088	0.002	1.10	0.029	0.001	0.37	0.118	0.003	1.47
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.125	0.001	12.50	-	-	-	0.125	0.001	12.50
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	1.000	0.001	50.00	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.058	0.000	5.83	0.058	0.000	5.83	0.117	0.000	11.67
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	21.000	0.001	42.00	29.000	0.001	58.00	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.125	0.005	1.56	-	-	-	0.125	0.005	1.56
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	0.125	0.004	1.56	-	-	-	0.125	0.004	1.56
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	0.125	0.002	1.56	-	-	-	0.125	0.002	1.56
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	196.000	0.071	33.97	24.000	0.009	4.16	220.000	0.080	38.13
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	2,094.000	0.138	31.83	1,193.532	0.079	18.14	3,287.532	0.216	49.97

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.300	0.099	30.00	0.025	0.008	2.50	0.325	0.107	32.50
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH B PEKERJAAN PERSIAPAN			**349,293,707.80**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	**PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Galian Tanah Pondasi Setempat (Manual)	M3	403.27	85,000.00	34,277,950.00	0.226	240.328	0.134	59.59	4.172	0.002	1.03	244.500	0.137	60.63
2	Galian Tanah Sloof (Manual)	M3	155.10	85,000.00	13,183,500.00	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengurugan Kembali Galian Tanah	M3	264.25	55,000.00	14,533,750.00	0.096	-	-	-	244.500	0.088	92.53	244.500	0.088	92.53
4	Pengurugan Tanah Urug (Tanah Dari Luar)	M3	5,042.83	150,000.00	756,424,500.00	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penghamparan, Perataan dan Pemadatan Tanah CBR Min 6 %	M3	5,042.83	50,000.00	252,141,500.00	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir Alas Pondasi, t = 10 cm	M3	13.62	300,510.00	4,092,946.20	0.027	-	-	-	13.620	0.027	100.00	13.620	0.027	100.00
7	Urugan Pasir Alas Sloof, t = 10 cm	M3	13.96	300,510.00	4,195,119.60	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lantai Kerja, K-100, Alas Pondasi, t = 5 cm	M3	27.25	850,000.00	23,162,500.00	0.152	-	-	-	20.800	0.116	76.33	20.800	0.116	76.33
9	Lantai Kerja, K-100, Alas Sloof, t = 5 cm	M3	27.91	850,000.00	23,723,500.00	0.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lantai Kerja, K-100, Alas Plat Lantai, t = 5 cm	M3	91.89	850,000.00	78,106,500.00	0.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Galian Tanah Pondasi Batu Belah	M3	199.63	85,000.00	16,968,550.00	0.112	17.928	0.010	8.98	0.803	0.000	0.40	18.731	0.010	9.38
12	Pemasangan Pondasi Batu Belah Type N (5,2 Mpa) Campuran 1SP : 4PP	M3	112.52	800,000.00	90,016,000.00	0.592	-	-	-	51.811	0.273	46.05	51.811	0.273	46.05
13	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping) Untuk Pondasi Gedung	M3	27.54	559,597.00	15,411,301.38	0.101	-	-	-	12.771	0.047	46.37	12.771	0.047	46.37
14	Pondasi (FPK-1) Uk. 200 x 200 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	38.40	1,280,000.00	49,152,000.00	0.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	4,215.82	15,000.00	63,237,300.00	0.416	-	-	-	3,201.540	0.316	75.94	3,201.540	0.316	75.94
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	76.80	130,000.00	9,984,000.00	0.066	-	-	-	76.800	0.066	100.00	76.800	0.066	100.00
15	Pondasi (FPK-2) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	9.50	1,280,000.00	12,160,000.00	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,494.11	15,000.00	22,411,650.00	0.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	31.68	130,000.00	4,118,400.00	0.027	-	-	-	31.680	0.027	100.00	31.680	0.027	100.00
16	Pondasi (FPK-3) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	7.78	1,280,000.00	9,958,400.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,222.46	15,000.00	18,336,900.00	0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	25.92	130,000.00	3,369,600.00	0.022	-	-	-	23.040	0.020	88.89	23.040	0.020	88.89

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan : Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. : : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian : 20 April 2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender
(20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 5 (KE LIMA)
Periode :
18 Mei 2026
s/d
24 Mei 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.125	0.001	12.50	0.018	0.000	1.79	0.143	0.001	14.29
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.125	0.001	12.50	0.018	0.000	1.79	0.143	0.001	14.29
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.125	0.000	12.50	0.018	0.000	1.79	0.143	0.000	14.29
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.125	0.000	12.50	0.018	0.000	1.79	0.143	0.000	14.29
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	-	-	-	1.000	0.002	50.00	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	1.000	0.001	20.00	1.000	0.001	20.00	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.118	0.003	1.47	0.025	0.001	0.32	0.143	0.004	1.79
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.125	0.001	12.50	0.018	0.000	1.79	0.143	0.001	14.29
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	-	-	-	1.000	0.001	100.00	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.117	0.000	11.67	-	-	-	0.117	0.000	11.67
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.125	0.005	1.56	0.018	0.001	0.22	0.143	0.006	1.79
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	0.125	0.004	1.56	0.018	0.001	0.22	0.143	0.005	1.79
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	0.125	0.002	1.56	0.018	0.000	0.22	0.143	0.002	1.79
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	220.000	0.080	38.13	27.900	0.010	4.84	247.900	0.090	42.96
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	3,287.532	0.216	49.97	-	-	-	3,287.532	0.216	49.97

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.325	0.107	32.50	0.018	0.006	1.79	0.343	0.113	34.29
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH B PEKERJAAN PERSIAPAN			**349,293,707.80**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	**PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Galian Tanah Pondasi Setempat (Manual)	M3	403.27	85,000.00	34,277,950.00	0.226	244.500	0.137	60.63	13.485	0.008	3.34	257.985	0.144	63.97
2	Galian Tanah Sloof (Manual)	M3	155.10	85,000.00	13,183,500.00	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengurugan Kembali Galian Tanah	M3	264.25	55,000.00	14,533,750.00	0.096	244.500	0.088	92.53	13.485	0.005	5.10	257.985	0.093	97.63
4	Pengurugan Tanah Urug (Tanah Dari Luar)	M3	5,042.83	150,000.00	756,424,500.00	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penghamparan, Perataan dan Pemadatan Tanah CBR Min 6 %	M3	5,042.83	50,000.00	252,141,500.00	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir Alas Pondasi, t = 10 cm	M3	13.62	300,510.00	4,092,946.20	0.027	13.620	0.027	100.00	-	-	-	13.620	0.027	100.00
7	Urugan Pasir Alas Sloof, t = 10 cm	M3	13.96	300,510.00	4,195,119.60	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lantai Kerja, K-100, Alas Pondasi, t = 5 cm	M3	27.25	850,000.00	23,162,500.00	0.152	20.800	0.116	76.33	6.450	0.036	23.67	27.250	0.152	100.00
9	Lantai Kerja, K-100, Alas Sloof, t = 5 cm	M3	27.91	850,000.00	23,723,500.00	0.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lantai Kerja, K-100, Alas Plat Lantai, t = 5 cm	M3	91.89	850,000.00	78,106,500.00	0.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Galian Tanah Pondasi Batu Belah	M3	199.63	85,000.00	16,968,550.00	0.112	18.731	0.010	9.38	1.751	0.001	0.88	20.482	0.011	10.26
12	Pemasangan Pondasi Batu Belah Type N (5,2 Mpa) Campuran 1SP : 4PP	M3	112.52	800,000.00	90,016,000.00	0.592	51.811	0.273	46.05	0.115	0.001	0.10	51.927	0.273	46.15
13	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping) Untuk Pondasi Gedung	M3	27.54	559,597.00	15,411,301.38	0.101	12.771	0.047	46.37	3.987	0.015	14.48	16.758	0.062	60.85
14	Pondasi (FPK-1) Uk. 200 x 200 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	38.40	1,280,000.00	49,152,000.00	0.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	4,215.82	15,000.00	63,237,300.00	0.416	3,201.540	0.316	75.94	1,014.280	0.100	24.06	4,215.820	0.416	100.00
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	76.80	130,000.00	9,984,000.00	0.066	76.800	0.066	100.00	-	-	-	76.800	0.066	100.00
15	Pondasi (FPK-2) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	9.50	1,280,000.00	12,160,000.00	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,494.11	15,000.00	22,411,650.00	0.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	31.68	130,000.00	4,118,400.00	0.027	31.680	0.027	100.00	-	-	-	31.680	0.027	100.00
16	Pondasi (FPK-3) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	7.78	1,280,000.00	9,958,400.00	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,222.46	15,000.00	18,336,900.00	0.121	-	-	-	164.944	0.016	13.49	164.944	0.016	13.49
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	25.92	130,000.00	3,369,600.00	0.022	23.040	0.020	88.89	-	-	-	23.040	0.020	88.89

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan : Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian : 20 April 2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender
(20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 6 (KE ENAM)
Periode :
25 Mei 2026
s/d
31 Mei 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.143	0.001	14.29	0.029	0.000	2.86	0.171	0.001	17.14
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.143	0.001	14.29	0.029	0.000	2.86	0.171	0.002	17.14
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.143	0.000	14.29	0.029	0.000	2.86	0.171	0.001	17.14
b		Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.143	0.000	14.29	0.029	0.000	2.86	0.171	0.001	17.14
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.143	0.004	1.79	0.029	0.001	0.36	0.171	0.005	2.14
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.143	0.001	14.29	0.029	0.000	2.86	0.171	0.001	17.14
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.117	0.000	11.67	0.055	0.000	5.48	0.171	0.000	17.14
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.143	0.006	1.79	0.029	0.001	0.36	0.171	0.007	2.14
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	0.143	0.005	1.79	0.029	0.001	0.36	0.171	0.006	2.14
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	0.143	0.002	1.79	0.029	0.000	0.36	0.171	0.003	2.14
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	247.900	0.090	42.96	267.380	0.097	46.34	515.280	0.186	89.30
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	3,287.532	0.216	49.97	-	-	-	3,287.532	0.216	49.97

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.343	0.113	34.29	0.029	0.009	2.86	0.371	0.122	37.14
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH B PEKERJAAN PERSIAPAN			**349,293,707.80**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	**PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	**PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Galian Tanah Pondasi Setempat (Manual)	M3	403.27	85,000.00	34,277,950.00	0.226	257.985	0.144	63.97	5.765	0.003	1.43	263.750	0.148	65.40
2	Galian Tanah Sloof (Manual)	M3	155.10	85,000.00	13,183,500.00	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengurugan Kembali Galian Tanah	M3	264.25	55,000.00	14,533,750.00	0.096	257.985	0.093	97.63	5.765	0.002	2.18	263.750	0.095	99.81
4	Pengurugan Tanah Urug (Tanah Dari Luar)	M3	5,042.83	150,000.00	756,424,500.00	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penghamparan, Perataan dan Pemadatan Tanah CBR Min 6 %	M3	5,042.83	50,000.00	252,141,500.00	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir Alas Pondasi, t = 10 cm	M3	13.62	300,510.00	4,092,946.20	0.027	13.620	0.027	100.00	-	-	-	13.620	0.027	100.00
7	Urugan Pasir Alas Sloof, t = 10 cm	M3	13.96	300,510.00	4,195,119.60	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lantai Kerja, K-100, Alas Pondasi, t = 5 cm	M3	27.25	850,000.00	23,162,500.00	0.152	27.250	0.152	100.00	-	-	-	27.250	0.152	100.00
9	Lantai Kerja, K-100, Alas Sloof, t = 5 cm	M3	27.91	850,000.00	23,723,500.00	0.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lantai Kerja, K-100, Alas Plat Lantai, t = 5 cm	M3	91.89	850,000.00	78,106,500.00	0.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Galian Tanah Pondasi Batu Belah	M3	199.63	85,000.00	16,968,550.00	0.112	20.482	0.011	10.26	-	-	-	20.482	0.011	10.26
12	Pemasangan Pondasi Batu Belah Type N (5,2 Mpa) Campuran 1SP : 4PP	M3	112.52	800,000.00	90,016,000.00	0.592	51.927	0.273	46.15	-	-	-	51.927	0.273	46.15
13	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping) Untuk Pondasi Gedung	M3	27.54	559,597.00	15,411,301.38	0.101	16.758	0.062	60.85	-	-	-	16.758	0.062	60.85
14	Pondasi (FPK-1) Uk. 200 x 200 x 30 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	38.40	1,280,000.00	49,152,000.00	0.323	-	-	-	38.400	0.323	100.00	38.400	0.323	100.00
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	4,215.82	15,000.00	63,237,300.00	0.416	4,215.820	0.416	100.00	-	-	-	4,215.820	0.416	100.00
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	76.80	130,000.00	9,984,000.00	0.066	76.800	0.066	100.00	-	-	-	76.800	0.066	100.00
15	Pondasi (FPK-2) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	9.50	1,280,000.00	12,160,000.00	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,494.11	15,000.00	22,411,650.00	0.147	-	-	-	1,494.110	0.147	100.00	1,494.110	0.147	100.00
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	31.68	130,000.00	4,118,400.00	0.027	31.680	0.027	100.00	-	-	-	31.680	0.027	100.00
16	Pondasi (FPK-3) Uk. 120 x 120 x 20 Cm						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pengecoran Beton Readymix K300 (f'c=25 Mpa) Dengan Pompa	M3	7.78	1,280,000.00	9,958,400.00	0.066	-	-	-	1.296	0.011	16.66	1.296	0.011	16.66
b	Pembesian Penulangan Slab Untuk BjTS Dia. > 12 mm, Cara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,222.46	15,000.00	18,336,900.00	0.121	164.944	0.016	13.49	1,057.516	0.104	86.51	1,222.460	0.121	100.00
c	Bekisting Pasangan Hebel	M2	25.92	130,000.00	3,369,600.00	0.022	23.040	0.020	88.89	2.880	0.002	11.11	25.920	0.022	100.00

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender (20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 7 (KE TUJUH)
Periode :
01 Juni 2026
s/d
07 Juni 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.171	0.002	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.002	20.00
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.171	0.005	2.14	0.029	0.001	0.36	0.200	0.005	2.50
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.171	0.000	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.000	20.00
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.171	0.007	2.14	0.029	0.001	0.36	0.200	0.009	2.50
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	0.171	0.006	2.14	0.029	0.001	0.36	0.200	0.007	2.50
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	0.171	0.003	2.14	0.029	0.000	0.36	0.200	0.003	2.50
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	515.280	0.186	89.30	-	-	-	515.280	0.186	89.30
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	3,287.532	0.216	49.97	3,290.868	0.217	50.03	6,578.400	0.433	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.371	0.122	37.14	-	-	-	0.371	0.122	37.14
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender (20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 7 (KE TUJUH)
Periode :
01 Juni 2026
s/d
07 Juni 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.171	0.002	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.002	20.00
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.171	0.005	2.14	0.029	0.001	0.36	0.200	0.005	2.50
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.171	0.001	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.001	20.00
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.171	0.000	17.14	0.029	0.000	2.86	0.200	0.000	20.00
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.171	0.007	2.14	0.029	0.001	0.36	0.200	0.009	2.50
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	0.171	0.006	2.14	0.029	0.001	0.36	0.200	0.007	2.50
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	0.171	0.003	2.14	0.029	0.000	0.36	0.200	0.003	2.50
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	515.280	0.186	89.30	-	-	-	515.280	0.186	89.30
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	3,287.532	0.216	49.97	3,290.868	0.217	50.03	6,578.400	0.433	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.371	0.122	37.14	- 0.000	- 0.000	- 0.00	0.371	0.122	37.14
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender (20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 8 (KE DELAPAN)
Periode :
08 Juni 2026
s/d
14 Juni 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.200	0.001	20.00	0.029	0.000	2.86	0.229	0.002	22.86
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.200	0.002	20.00	0.029	0.000	2.86	0.229	0.002	22.86
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.200	0.001	20.00	0.029	0.000	2.86	0.229	0.001	22.86
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.200	0.001	20.00	0.029	0.000	2.86	0.229	0.001	22.86
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Perunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.200	0.005	2.50	0.029	0.001	0.36	0.229	0.006	2.86
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.200	0.001	20.00	0.029	0.000	2.86	0.229	0.001	22.86
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.200	0.000	20.00	0.029	0.000	2.86	0.229	0.000	22.86
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.200	0.009	2.50	0.029	0.001	0.36	0.229	0.010	2.86
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	0.200	0.007	2.50	0.029	0.001	0.36	0.229	0.008	2.86
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	0.200	0.003	2.50	0.029	0.000	0.36	0.229	0.004	2.86
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	515.280	0.186	89.30	-	-	-	515.280	0.186	89.30
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	6,578.400	0.433	100.00	-	-	-	6,578.400	0.433	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.371	0.122	37.14	0.057	0.019	5.71	0.429	0.141	42.86
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender (20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 9 (KE SEMBILAN)
Periode :
15 Juni 2026
s/d
21 Juni 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.229	0.002	22.86	0.029	0.000	2.86	0.257	0.002	25.71
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.229	0.002	22.86	0.029	0.000	2.86	0.257	0.003	25.71
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.229	0.001	22.86	0.029	0.000	2.86	0.257	0.001	25.71
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.229	0.001	22.86	0.029	0.000	2.86	0.257	0.001	25.71
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	0.229	0.006	2.86	1.829	0.048	22.86	2.057	0.054	25.71
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.229	0.001	22.86	0.029	0.000	2.86	0.257	0.001	25.71
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.229	0.000	22.86	0.029	0.000	2.86	0.257	0.000	25.71
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	0.229	0.010	2.86	1.829	0.078	22.86	2.057	0.088	25.71
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	0.229	0.008	2.86	1.829	0.060	22.86	2.057	0.068	25.71
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	0.229	0.004	2.86	1.829	0.030	22.86	2.057	0.034	25.71
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	515.280	0.186	89.30	-	-	-	515.280	0.186	89.30
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	6,578.400	0.433	100.00	-	-	-	6,578.400	0.433	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.429	0.141	42.86	0.029	0.009	2.86	0.457	0.150	45.71
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender (20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 10 (KE SEPULUH)
Periode :
22 Juni 2026
s/d
28 Juni 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.257	0.002	25.71	0.029	0.000	2.86	0.286	0.002	28.57
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.257	0.003	25.71	0.029	0.000	2.86	0.286	0.003	28.57
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.257	0.001	25.71	0.029	0.000	2.86	0.286	0.001	28.57
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.257	0.001	25.71	0.029	0.000	2.86	0.286	0.001	28.57
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	2.057	0.054	25.71	0.229	0.006	2.86	2.286	0.060	28.57
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.257	0.001	25.71	0.029	0.000	2.86	0.286	0.001	28.57
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.257	0.000	25.71	0.029	0.000	2.86	0.286	0.000	28.57
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	2.057	0.088	25.71	0.229	0.010	2.86	2.286	0.098	28.57
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	2.057	0.068	25.71	0.229	0.008	2.86	2.286	0.075	28.57
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	2.057	0.034	25.71	0.229	0.004	2.86	2.286	0.038	28.57
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	515.280	0.186	89.30	-	-	-	515.280	0.186	89.30
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	6,578.400	0.433	100.00	-	-	-	6,578.400	0.433	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.457	0.150	45.71	0.029	0.009	2.86	0.486	0.160	48.57
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender (20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :
MINGGU KE : 11 (KE SEBELAS)
Periode :
29 Juni 2026
s/d
05 Juli 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**														
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK														
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.286	0.002	28.57	0.029	0.000	2.86	0.314	0.002	31.43
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.286	0.003	28.57	0.029	0.000	2.86	0.314	0.003	31.43
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.286	0.001	28.57	0.029	0.000	2.86	0.314	0.001	31.43
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.286	0.001	28.57	0.029	0.000	2.86	0.314	0.001	31.43
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat Pelindung Diri (APD)						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021						-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
							Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	2.286	0.060	28.57	0.229	0.006	2.86	2.514	0.066	31.43
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.286	0.001	28.57	0.029	0.000	2.86	0.314	0.002	31.43
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	-	-	-	1.000	0.001	50.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.286	0.000	28.57	0.029	0.000	2.86	0.314	0.000	31.43
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3						-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	2.286	0.098	28.57	0.229	0.010	2.86	2.514	0.108	31.43
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	2.286	0.075	28.57	0.229	0.008	2.86	2.514	0.083	31.43
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	2.286	0.038	28.57	0.229	0.004	2.86	2.514	0.041	31.43
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	55,000.00	31,736,100.00	0.209	515.280	0.186	89.30	-	-	-	515.280	0.186	89.30
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	6,578.400	0.433	100.00	-	-	-	6,578.400	0.433	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.486	0.160	48.57	0.029	0.009	2.86	0.514	0.169	51.43
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terdiri dari : 2 Main Frame Tinggi 190 Cm, 2 Cross Brace Panjang 220 Cm, 4 Joint Pin Warna, Ketebalan Pipa Utama 1.8 mm Ketebalan Pipa Penunjang 1.5 mm Standar SNI						-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
No. Adendum I	: 08/KONTRAK.ADD1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026
Tgl. Adendum I	: 07 Juli 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
	(20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :

MINGGU KE : 12 (KE DUA BELAS)

Periode :

06 Juli 2026

s/d

12 Juli 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK	ADENDUM KONTRAK KE 1				PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
			VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**															
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK															
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.314	0.002	31.43	0.029	0.000	2.86	0.343	0.002	34.29
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.314	0.003	31.43	0.029	0.000	2.86	0.343	0.003	34.29
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.314	0.001	31.43	0.029	0.000	2.86	0.343	0.001	34.29
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.314	0.001	31.43	0.029	0.000	2.86	0.343	0.001	34.29
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	1.000	0.001	50.00	2.000	0.001	100.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	-	-	-	1.000	0.036	100.00	1.000	0.036	100.00
4	Alat Pelindung Diri (APD)							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK	ADENDUM KONTRAK KE 1				PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
			VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	2.514	0.066	31.43	0.229	0.006	2.86	2.743	0.072	34.29
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.314	0.002	31.43	0.029	0.000	2.86	0.343	0.002	34.29
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	1.000	0.001	50.00	1.000	0.001	50.00	2.000	0.001	100.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	-	-	-	5.000	0.002	100.00	5.000	0.002	100.00
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	0.314	0.000	31.43	0.686	0.000	68.57	1.000	0.001	100.00
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				87,385,637.84		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**							-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik							-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	2.514	0.108	31.43	0.229	0.010	2.86	2.743	0.117	34.29
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	2.514	0.083	31.43	0.229	0.008	2.86	2.743	0.090	34.29
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	2.514	0.041	31.43	0.229	0.004	2.86	2.743	0.045	34.29
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	576.48	55,000.00	31,706,400.00	0.209	515.280	0.186	89.38	-	-	-	515.280	0.186	89.38
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	6,578.400	0.433	100.00	-	-	-	6,578.400	0.433	100.00
8'	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat (Timpang)	M2		28.59	4,900.00	140,091.00	0.001	-	-	-	28.590	0.001	100.00	28.590	0.001	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.514	0.169	51.43	0.029	0.009	2.86	0.543	0.179	54.29
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	-	-	-	1.000	0.046	20.00	1.000	0.046	20.00

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEMILIK PEKERJAAN

KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG

KONSULTAN PENGAWAS

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

INFORMASI PEKERJAAN

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
No. Surat Perjanjian	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Tgl. Surat Perjanjian	: 20 April 2026
No. Adendum I	: 08/KONTRAK.ADD1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026
Tgl. Adendum I	: 07 Juli 2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
	(20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

PERIODE LAPORAN

Minggu Ke- :

MINGGU KE : 13 (KE TIGA BELAS)

Periode :

13 Juli 2026

s/d

19 Juli 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK	ADENDUM KONTRAK KE 1				PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
			VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
A	**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**															
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK															
a	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Set	1.00	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.007	0.343	0.002	34.29	0.029	0.000	2.86	0.371	0.002	37.14
b	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Ls	1.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.010	0.343	0.003	34.29	0.029	0.000	2.86	0.371	0.004	37.14
2	Solsialisasi, Promosi, dan Pelatihan							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Induksi Keselamatan Kontruksi (Safety Induction)	Ls	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.343	0.001	34.29	0.029	0.000	2.86	0.371	0.001	37.14
b	Pengarahan Keselamatan Kontruksi (Safety Briefing)	Ls	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	0.343	0.001	34.29	0.029	0.000	2.86	0.371	0.001	37.14
c	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	1.000	0.003	100.00	-	-	-	1.000	0.003	100.00
d	Spanduk (Banner)	Unit	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	2.000	0.001	100.00	-	-	-	2.000	0.001	100.00
e	Papan Informasi Keselamatan Kontruksi	Unit	1.00	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
3	Alat Pengaman Kerja (APK)							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kap. 6 Kg	Bh	2.00	2.00	350,000.00	700,000.00	0.005	1.000	0.002	50.00	-	-	-	1.000	0.002	50.00
b	Life Line (Tambang Manila 25 mm)	M	100.00	100.00	45,000.00	4,500,000.00	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Police Line (Barikade Tape) 8 cm	Roll	5.00	5.00	87,900.00	439,500.00	0.003	2.000	0.001	40.00	-	-	-	2.000	0.001	40.00
d	Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1.00	1.00	800,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.036	1.000	0.036	100.00	-	-	-	1.000	0.036	100.00
4	Alat Pelindung Diri (APD)							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50.00	50.00	40,000.00	2,000,000.00	0.013	50.000	0.013	100.00	-	-	-	50.000	0.013	100.00
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	10.00	45,000.00	450,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Bh	50.00	50.00	12,000.00	600,000.00	0.004	50.000	0.004	100.00	-	-	-	50.000	0.004	100.00
d	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Khusus Staf Proyek	Bh	15.00	15.00	100,000.00	1,500,000.00	0.010	15.000	0.010	100.00	-	-	-	15.000	0.010	100.00
e	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	Bh	50.00	50.00	150,000.00	7,500,000.00	0.049	50.000	0.049	100.00	-	-	-	50.000	0.049	100.00
f	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	3.00	3.00	300,000.00	900,000.00	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK	ADENDUM KONTRAK KE 1				PRESTASI S/D MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI			PRESTASI S/D MINGGU INI		
			VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres	Vol	Bobot	Progres
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	15.00	15.00	35,000.00	525,000.00	0.003	15.000	0.003	100.00	-	-	-	15.000	0.003	100.00
5	Asuransi JKK dan JKM, Permenaker No. 5 Tahun 2021							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,09% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1.00	17,096,524.05	17,096,524.05	0.113	1.000	0.113	100.00	-	-	-	1.000	0.113	100.00
b	Iuran Jaminan Kematian (JKM) (0,01% dari nilai kontrak sebelum PPN)	Ls	1.00	1.00	1,899,613.78	1,899,613.78	0.013	1.000	0.013	100.00	-	-	-	1.000	0.013	100.00
6	Personil Keselamatan Konstruksi							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ahli K3 Konstruksi	OB	8.00	8.00	4,000,000.00	32,000,000.00	0.211	2.743	0.072	34.29	0.229	0.006	2.86	2.971	0.078	37.14
7	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1.00	1.00	750,000.00	750,000.00	0.005	0.343	0.002	34.29	0.029	0.000	2.86	0.371	0.002	37.14
8	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Senter Traffic Panjang	Bh	1.00	1.00	150,000.00	150,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
b	Rubber Cone,Uk. 70 cm	Bh	4.00	4.00	200,000.00	800,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Rambu " Hati2 Keluar Masuk Kendaraan Proyek "	Ls	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	2.000	0.001	100.00	-	-	-	2.000	0.001	100.00
e	Rompi Siang Malam Untuk Karyawan	Set	5.00	5.00	65,000.00	325,000.00	0.002	5.000	0.002	100.00	-	-	-	5.000	0.002	100.00
f	Lampu Rotary (Lampu Emergency)	Pcs	1.00	1.00	200,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Rambu "Hati2 Ada Pekerjaan" (Malam Bisa Menyala)	Ls	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Rambu Panah (Kalau Malam Bisa Menyala)	Bh	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Rambu-Rambu : (Informasi, Petunjuk, Larangan dan Peringatan)	Ls	1.00	1.00	100,000.00	100,000.00	0.001	1.000	0.001	100.00	-	-	-	1.000	0.001	100.00
9	Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3							-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bendera K3 (PT, K3, Merah Putih)	Set	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.00	50.00	5,000.00	250,000.00	0.002	50.000	0.002	100.00	-	-	-	50.000	0.002	100.00
c	Handy Talky (Alinco) untuk Petugas K3L (SHEO+SS)	Bh	2.00	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.020	2.000	0.020	100.00	-	-	-	2.000	0.020	100.00
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				**87,385,637.84**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**PEKERJAAN PERSIAPAN**							-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pembuatan Nama Proyek	Bh	1.00	1.00	588,989.00	588,989.00	0.004	1.000	0.004	100.00	-	-	-	1.000	0.004	100.00
	Ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, Frame Aluminium siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik							-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Kantor Direksi Keet Kontainer 40 feet (Lengkap Sarana Kantor dan Toilet)	Bulan	8.00	8.00	6,500,000.00	52,000,000.00	0.342	2.743	0.117	34.29	0.229	0.010	2.86	2.971	0.127	37.14
3	Sewa Gudang Material Kontainer 40 feet	Bulan	8.00	8.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.263	2.743	0.090	34.29	0.229	0.008	2.86	2.971	0.098	37.14
4	Biaya Listrik Kerja (23 KVA)	Bulan	8.00	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00	0.132	2.743	0.045	34.29	0.229	0.004	2.86	2.971	0.049	37.14
5	Sumur Bor + Pompa + Suport Kedalaman 40 m'	Titik	1.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.066	1.000	0.066	100.00	-	-	-	1.000	0.066	100.00
6	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M	577.02	576.48	55,000.00	31,706,400.00	0.209	515.280	0.186	89.38	-	-	-	515.280	0.186	89.38
7	Pembersihan Awal dan Akhir Area Gedung	M2	247.02	247.02	16,940.00	4,184,518.80	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat	M2	6,578.41	6,578.41	10,000.00	65,784,100.00	0.433	6,578.400	0.433	100.00	-	-	-	6,578.400	0.433	100.00
8'	Stripping/Kupas Tanah Top Soil Menggunakan Alat Berat (Timpang)	M2		28.59	4,900.00	140,091.00	0.001	28.590	0.001	100.00	-	-	-	28.590	0.001	100.00
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Pekerja dan Peralatan Tukang	Ls	1.00	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.329	0.543	0.179	54.29	0.029	0.009	2.86	0.571	0.188	57.14
10	Pengurusan PBG dan SLF	Ls	1.00	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sewa Scafolding 170 Set	Bulan	5.00	5.00	7,000,000.00	35,000,000.00	0.230	1.000	0.046	20.00	-	-	-	1.000	0.046	20.00



PHOTO DOKUMENTASI

PERIODE : 20 APRIL 2026 S/D 26 JULI 2026

PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG UPT BKN BANDUNG

NOMOR KONTRAK : 08/KONTRAK/PPK/UPTBDG.F/KR.III/IV/2026
TANGGAL : 20 APRIL 2026
NOMOR ADDEENDUM 1 : 0 8/KONTRAK.ADD1/PPK/UPTBDG.F/KR.III/IV/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

TAHUN ANGGARAN

2026


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL III
Jl Suropati Nomor 10 CibiuyingKaler Bandung - Jawa Barat 40124
Telp (022) 7272021 : Fax (022) 7206182 Laman:wwwbandung bkn go.id
Pos-elkanreg3bandung@bkn.go.id

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. LESTARI ASI SEJAHTERA
KONSULTAN PENGAWAS : PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

	Hari : Minggu Tanggal : 26/2026 Minggu ke : 14 (Empatbelas)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN

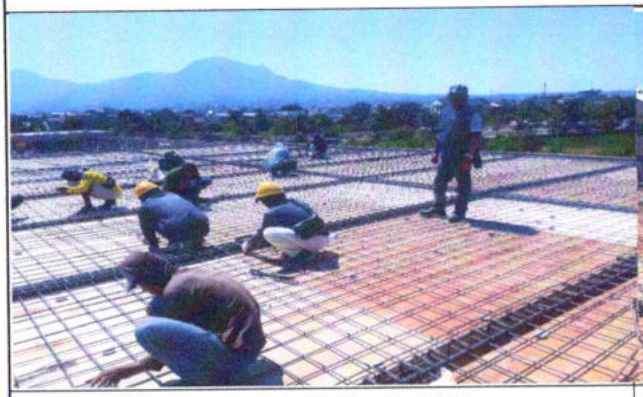

PEMBESIAN PLAT DAK BELAKANG



PEMBESIAN PLAT DAK BELAKANG

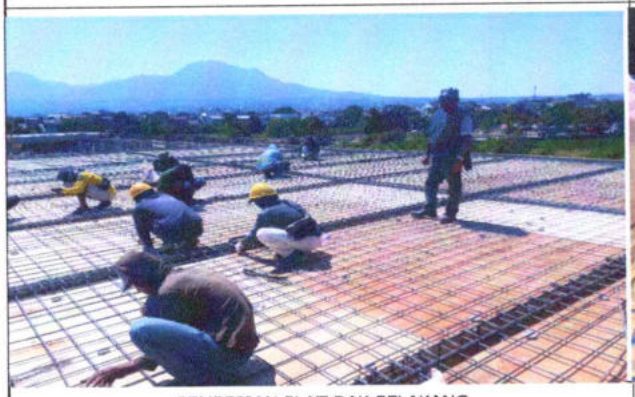


PEMBESIAN PLAT DAK BELAKANG



PEMBESIAN PLAT DAK BELAKANG



CEKLIST PEMBESIAN

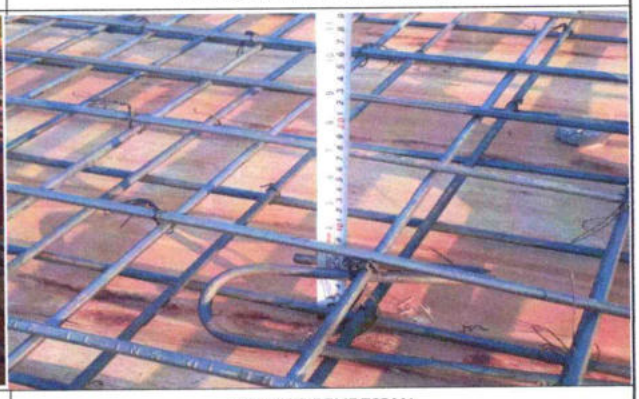

CEKLIST PEMBESIAN



CEK SLUMP BETON



CEK SLUMP BETON


	Hari : Minggu Tanggal : 26/2026 Minggu ke : 14 (Empatbelas)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026 Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



PENGECORAN PLAT DAK BELAKANG

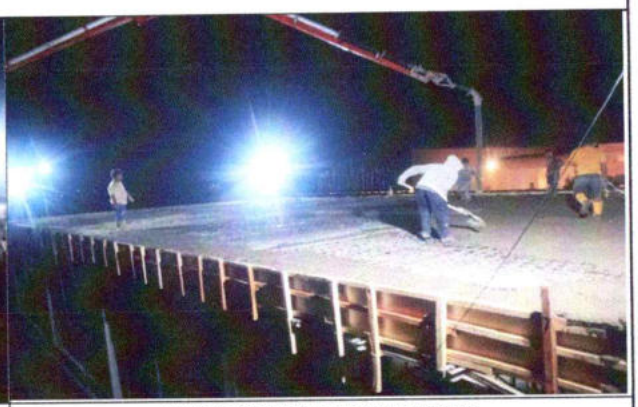

PENGECORAN PLAT DAK BELAKANG

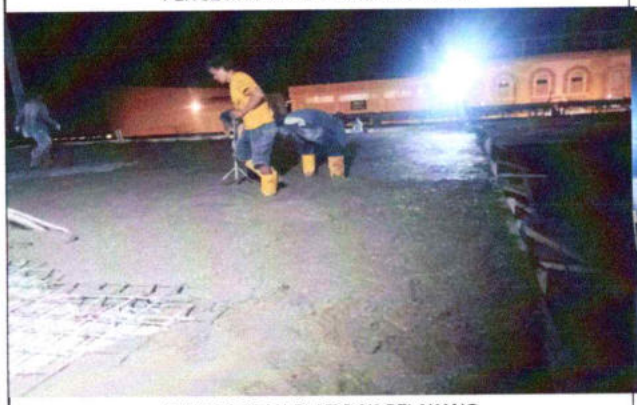


PENGECORAN PLAT DAK BELAKANG



PENGECORAN PLAT DAK BELAKANG



PEMBESIAN PLAT DAK DEPAN

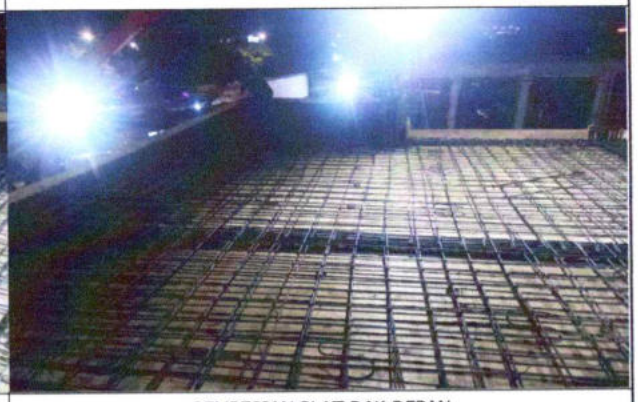

PEMBESIAN PLAT DAK DEPAN



PEMBESIAN PLAT DAK DEPAN




PEMBESIAN PLAT DAK DEPAN

Binamitra Bangunsarana Pratama


Hari	: Minggu
Tanggal	: 26/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN

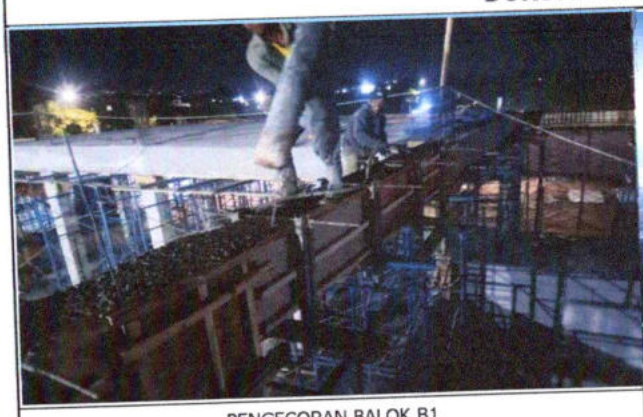

PENGECORAN BALOK B1

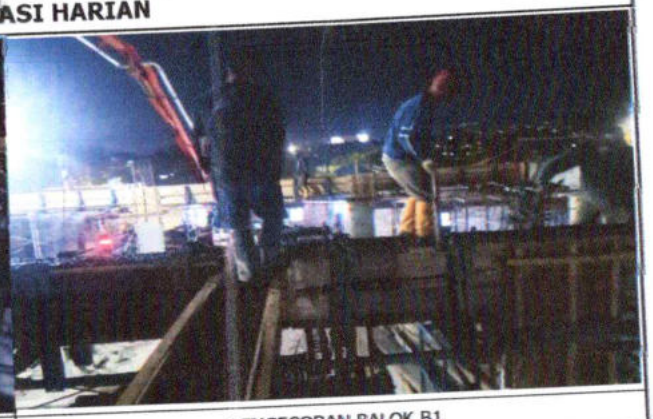

PENGECORAN BALOK B1



PENGECORAN PLAT DAK DEPAN




PENGECORAN PLAT DAK DEPAN



PENGECORAN PLAT DAK DEPAN



PENGECORAN PLAT DAK DEPAN

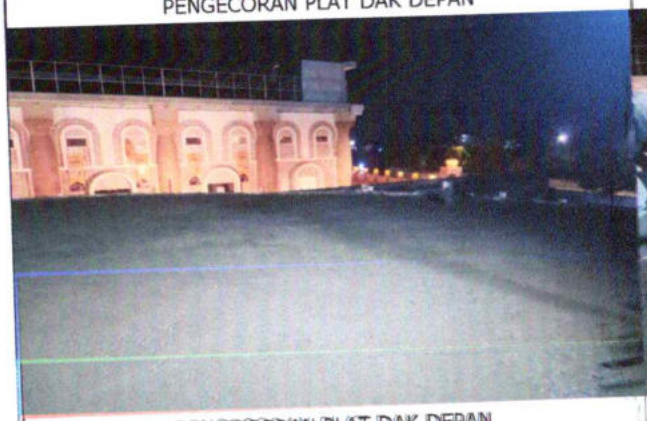

PENGECORAN PLAT DAK DEPAN




PENGECORAN PLAT DAK DEPAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 25/2026
Minggu ke : 14 (Empatbelas)


Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN

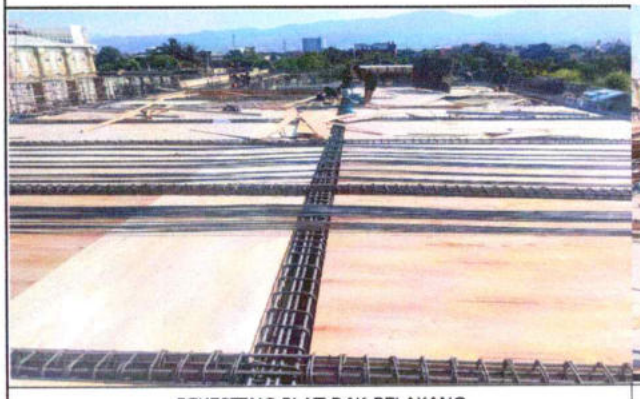


BEKESTING PLAT DAK BELAKANG

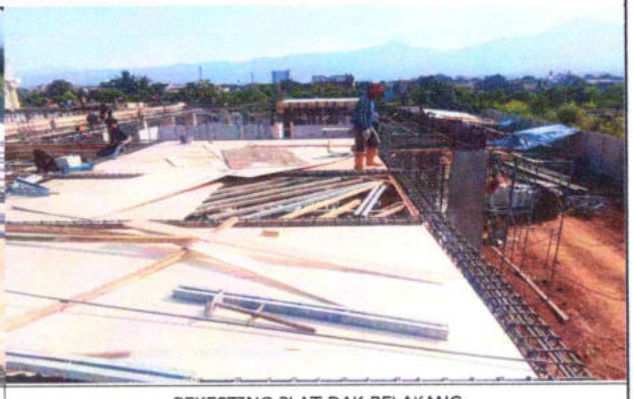


BEKESTING PLAT DAK BELAKANG

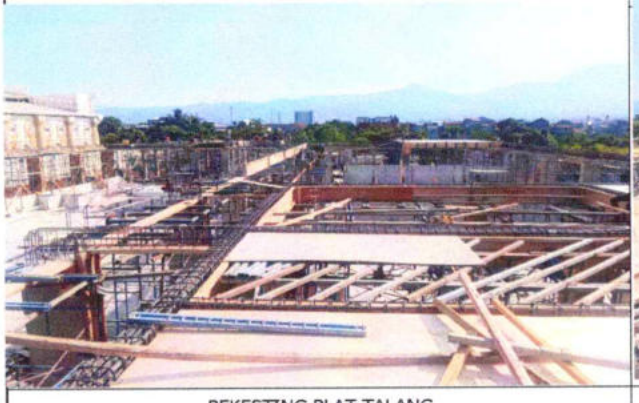


BEKESTING PLAT TALANG

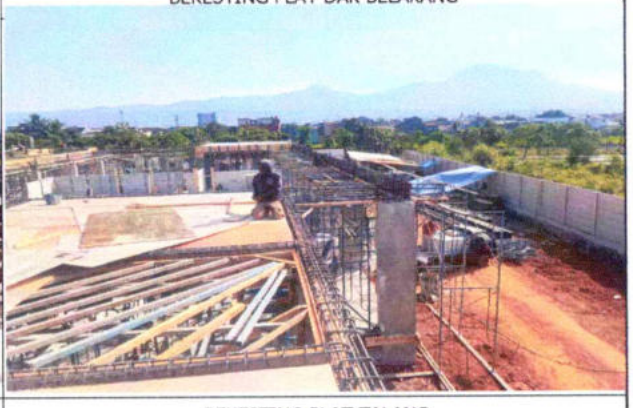

BEKESTING PLAT TALANG

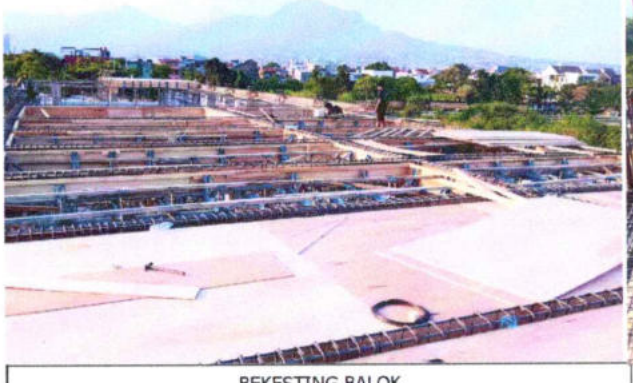

BEKESTING BALOK

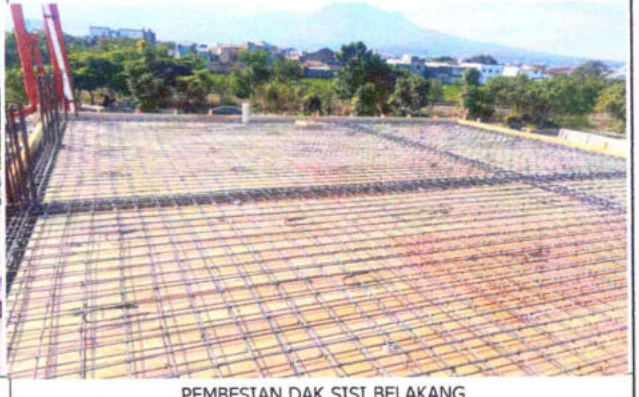

PEMBESIAN DAK SISI BELAKANG



PEMBESIAN DAK SISI BELAKANG



PEMBESIAN DAK SISI BELAKANG

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 24/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN




BEKESTING BALOK DAK DEPAN



BEKESTING BALOK DAK DEPAN

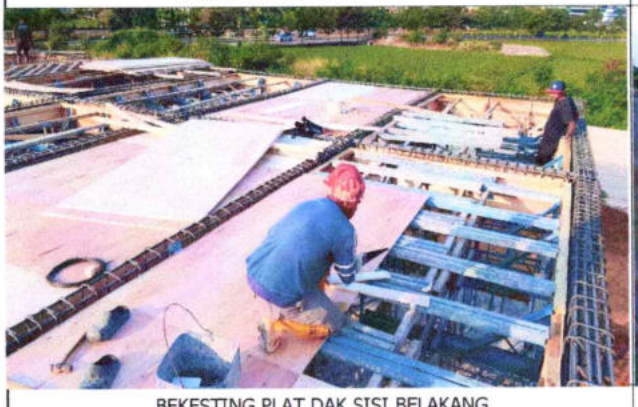


BEKESTING PLAT DAK SISI BELAKANG

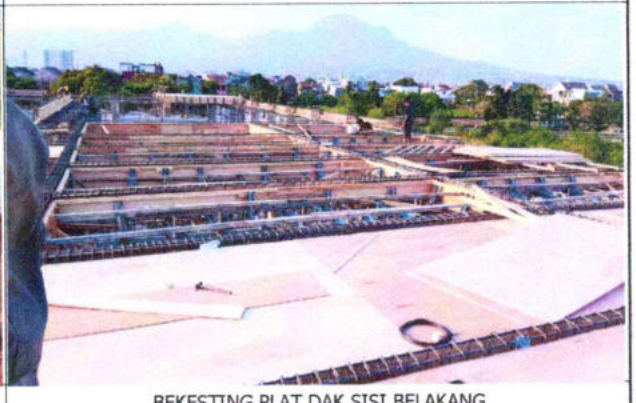

BEKESTING PLAT DAK SISI BELAKANG



BEKESTING BALOK

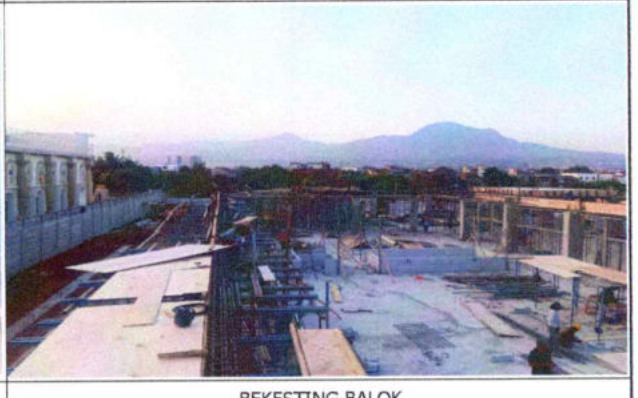

BEKESTING BALOK



BEKESTING BALOK



PEMBESIAN BALOK

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 24/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN BALOK



BEKESTING PLAT DAK GD UTILITAS



CEK LIST LAPANGAN PROGRESS MINGGU 14



CEK LIST LAPANGAN PROGRESS MINGGU 14



CEK LIST LAPANGAN PROGRESS MINGGU 14



CEK LIST LAPANGAN PROGRESS MINGGU 14



CEK LIST LAPANGAN PROGRESS MINGGU 14




CEK LIST LAPANGAN PROGRESS MINGGU 14

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 24/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN

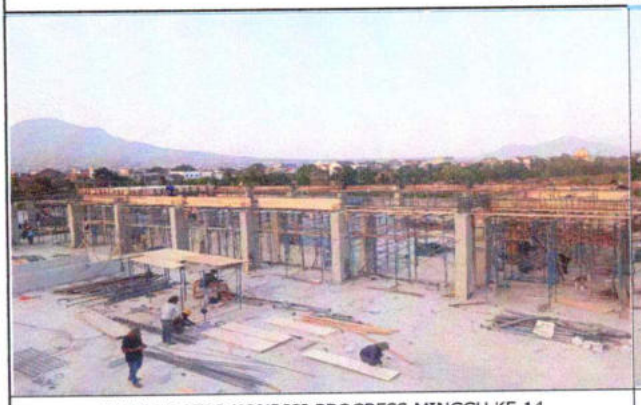


TAMPAK ATAS KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14



TAMPAK ATAS KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14




TAMPAK ATAS KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14

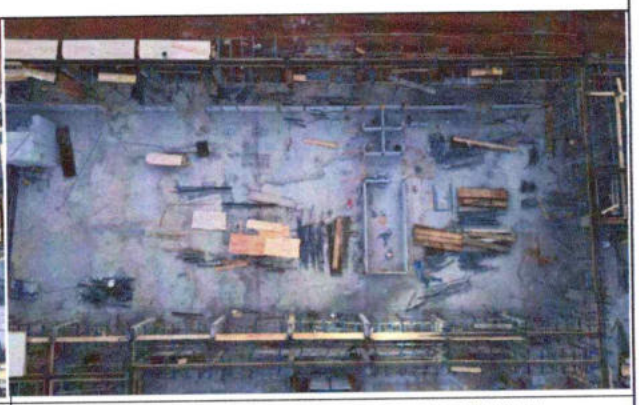

TAMPAK ATAS KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14



TAMPAK ATAS KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14

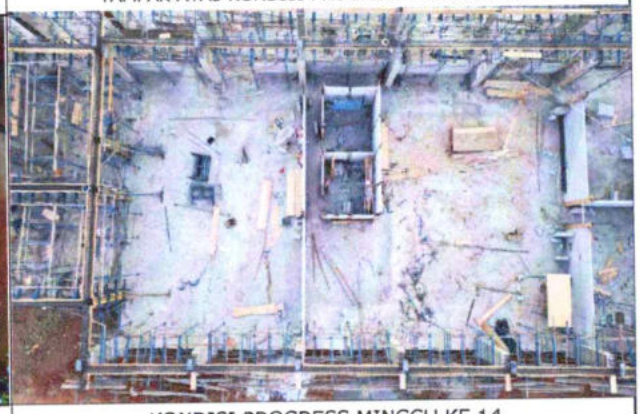

KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14



KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14




KONDISI PROGRESS MINGGU KE 14

Hari : Kamis Tanggal : 23/2026 Minggu ke : 14 (Empatbelas)	

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026 Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN

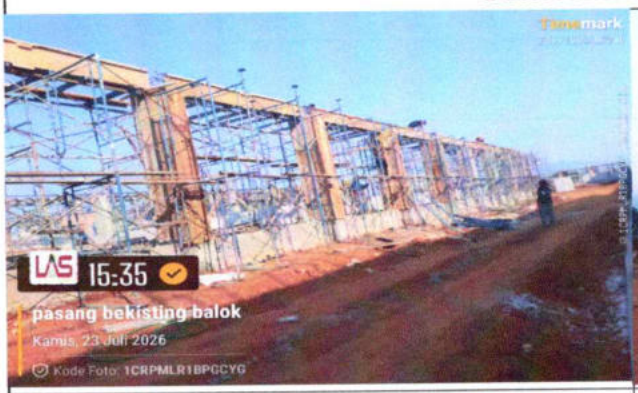

PEKERJAAN BEKESTING BALOK



PEKERJAAN BEKESTING BALOK



BEKESTING PLAT DAK DEPAN



BEKESTING PLAT DAK BELAKANG



PONDASI PASANGAN BATU



LANTAI KERJA UNTUK UDITCH



PEMASANGAN ANGKUR



PEMBESIAN BALOK

Hari	: Kamis
Tanggal	: 23/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




PEMBESIAN BALOK



PEMBESIAN BALOK



PEMBESIAN BALOK

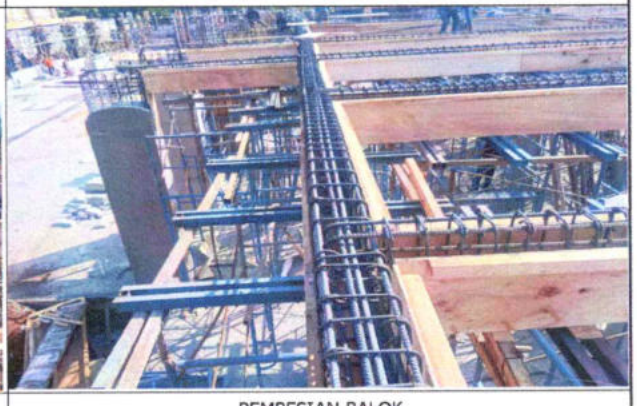


PEMBESIAN BALOK



PEMBESIAN BALOK



BEKESTING DAK

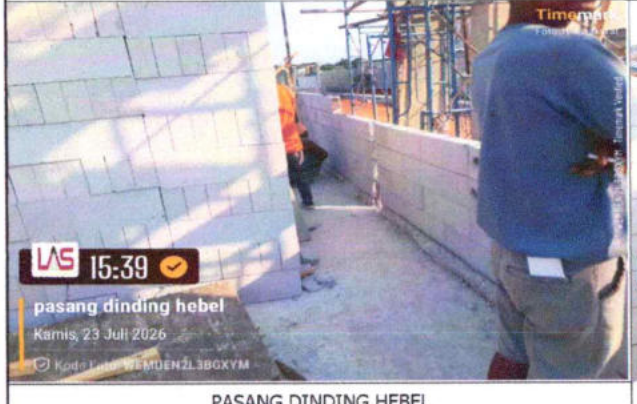

PASANG DINDING HEBEL



PASANG DINDING HEBEL

Hari	: Rabu
Tanggal	: 22/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN PLAT DAK



PEMBESIAN PLAT DAK



PASANG BES1 PLAT & ANGKUR




PASANG BES1 PLAT & ANGKUR



PASANGAN DINDING HEBEL



PASANGAN DINDING HEBEL

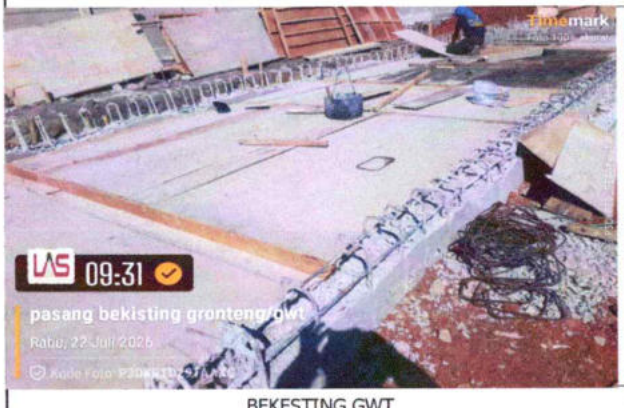

BEKESTING GWT



PEMBESIAN GWT

Hari	: Rabu
Tanggal	: 22/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PENGECORAN GWT



CURING PLAT GWT



PENGECORAN KOLOM



PENGECORAN KOLOM




KUNJUNGAN KAKANREK KE LAPANGAN



PEMBESIAN PLAT DAK SISI DEPAN



PENGECORAN PLAT DAK SISI DEPAN

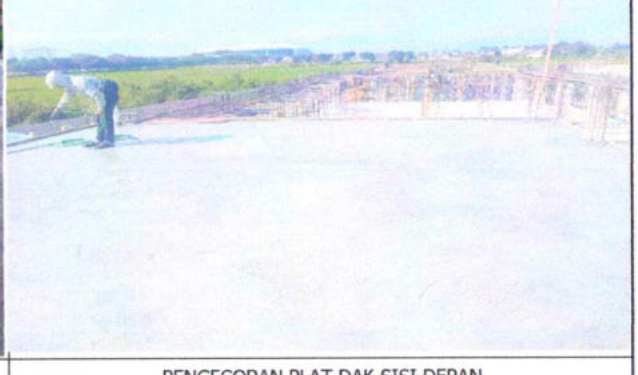

PENGECORAN PLAT DAK SISI DEPAN

Hari	: Selasa
Tanggal	: 21/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING PLAT DAK



BEKESTING PLAT DAK



BEKESTING BALOK



BEKESTING KOLOM



BEKESTING KOLOM




PONDASI PASANGAN BATU



PEMBESIAN BALOK



PEMBESIAN BALOK





Hari	: Selasa
Tanggal	: 21/2026
Minggu ke	: 14 (Empatbelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



PASANG DINDING HEBEL




PASANG DINDING HEBEL

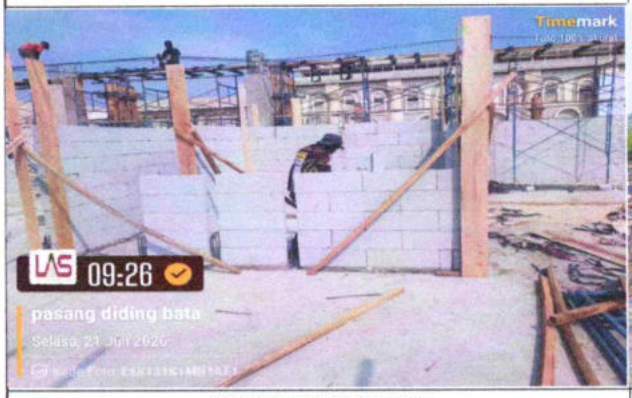

PASANG DINDING HEBEL




PASANG PLAT DAK UTILITAS

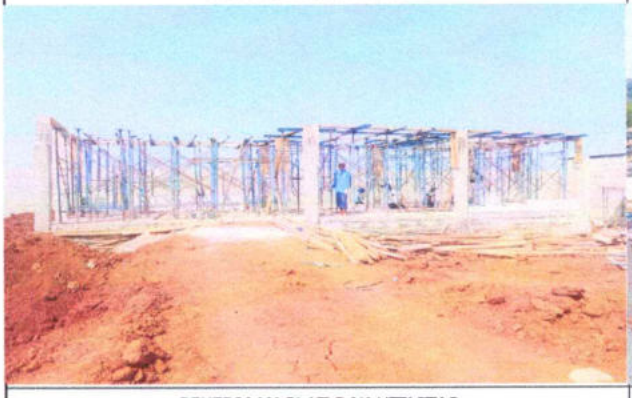

PEKERJAAN PLAT DAK UTILITAS



PEMBESIAN BALOK

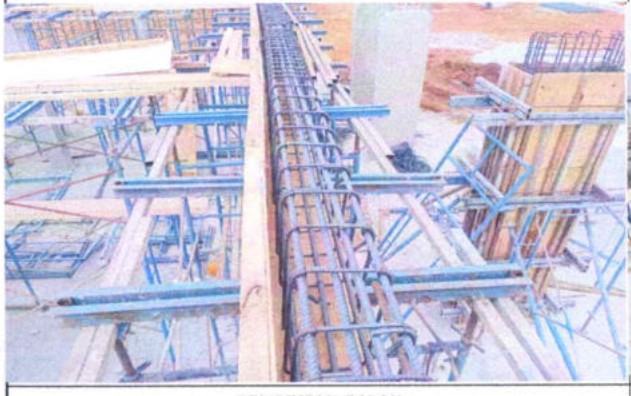

PEMBESIAN BALOK



PEMBESIAN BALOK

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

Hari : Senin
Tanggal : 20/2026
Minggu ke : 14 (Empatbelas)


DOKUMENTASI HARIAN



PENGURUGAN KEMBALI GALIAN TANAH



BEKETING DAK GWT

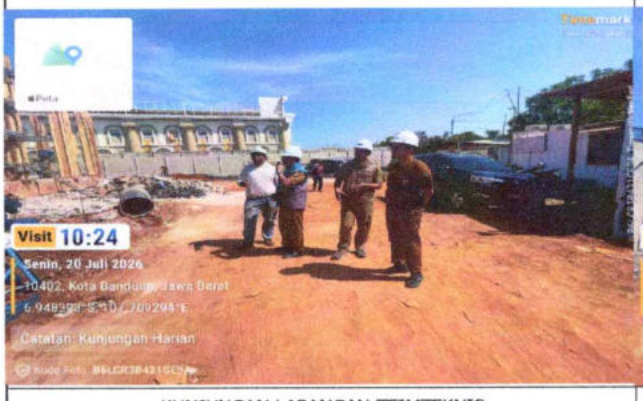

KUNJUNGAN LAPANGAN TEIMTEKNIS



KUNJUNGAN LAPANGAN TEIMTEKNIS



KUNJUNGAN LAPANGAN PPK



KUNJUNGAN LAPANGAN PPK



PEMASANGAN ANGKUR



PEMASANGAN ANGKUR

Hari : Senin Tanggal : 20/2026 Minggu ke : 14 (Empatbelas)	

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




BEKETING BALOK



BEKETING BALOK




PEMBESIAN BALOK

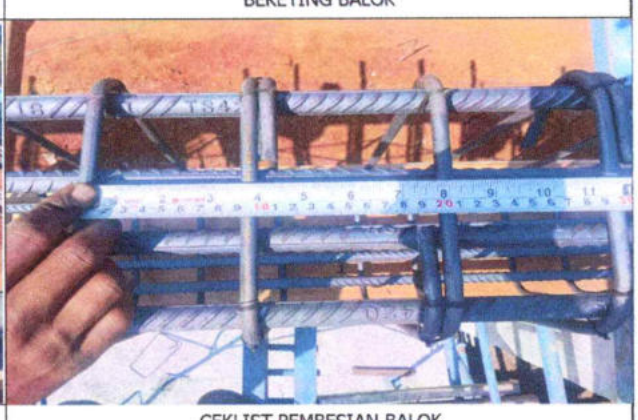

CEKLIST PEMBESIAN BALOK



PEMBESIAN BALOK

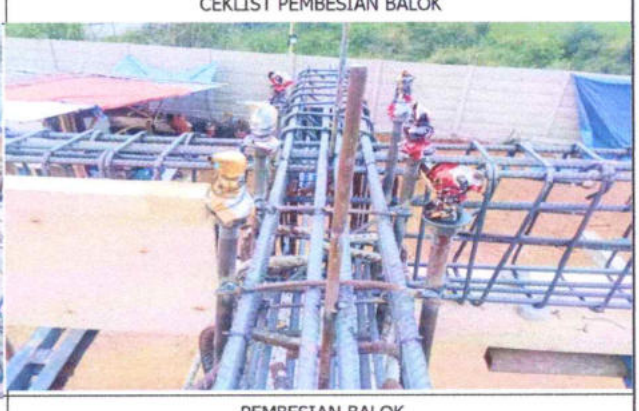

PEMBESIAN BALOK



GALIAN TANAH PONDASI PASANGAN BATU



PASANGAN BATU

Hari	: Minggu
Tanggal	: 19/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI S/D 19 JULI 2026



PEMBONGKARAN BEKESTING GWT



BEKESTING BALOK




BEKESTING KOLOM



BEKESTING KOLOM



TAMPAK KIRI

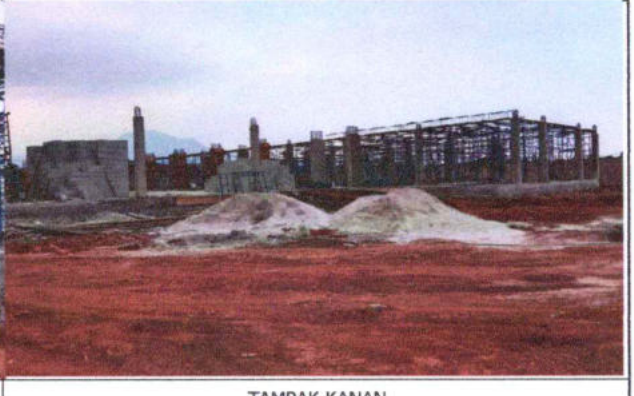

TAMPAK KANAN



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG


Hari	: Sabtu
Tanggal	: 18/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMASANGAN TUTUP UDITH

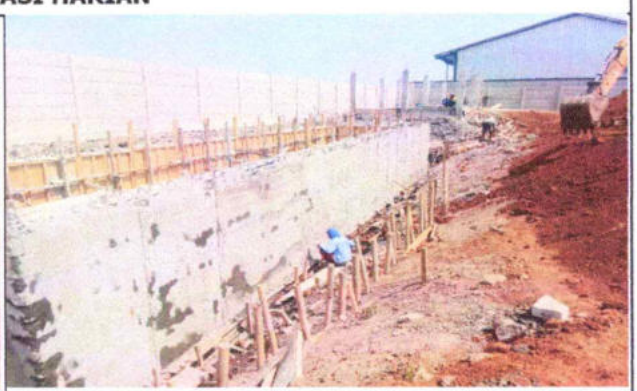


PEMBONGKARAN BEKESTING DINDING GWT



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH

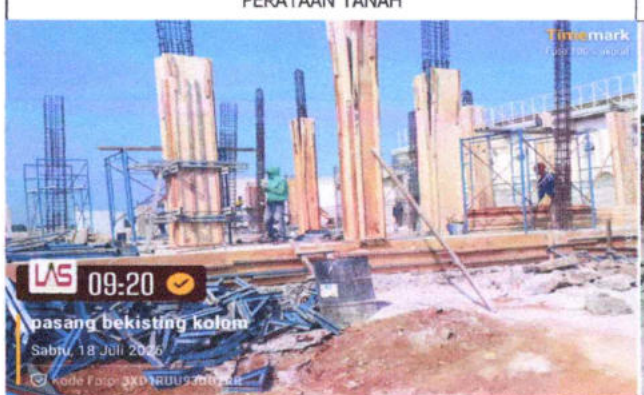

PEMBESIAN BALOK



PEMASANGAN DINDING HEBEL



PEMBESIAN BALOK



PEMBESIAN BALOK

Hari	: Jum,at
Tanggal	: 17/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN




PEKERJAANNSKAPOLDING BALOK



PEKERJAANNSKAPOLDING BALOK

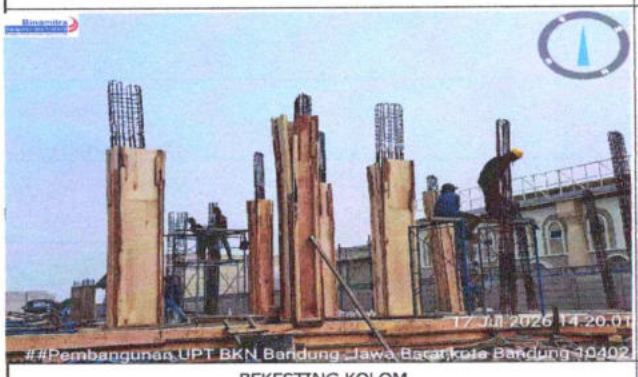

BEKESTING KOLOM

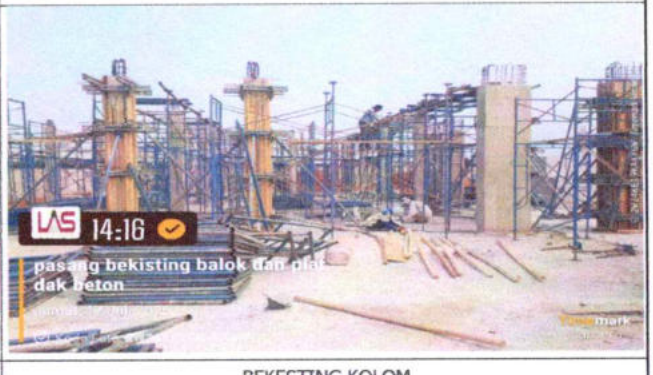

BEKESTING KOLOM



LANTAI KERJA PEK UDITCH



PEMASANGAN UDITCH



PEMASANGAN UDITCH



PEMASANGAN UDITCH

Hari	: Jum,at
Tanggal	: 17/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




PEBRIKASI ATAP BAJA



PEBRIKASI ATAP BAJA



PEKERJAAN PLAT LANTAI

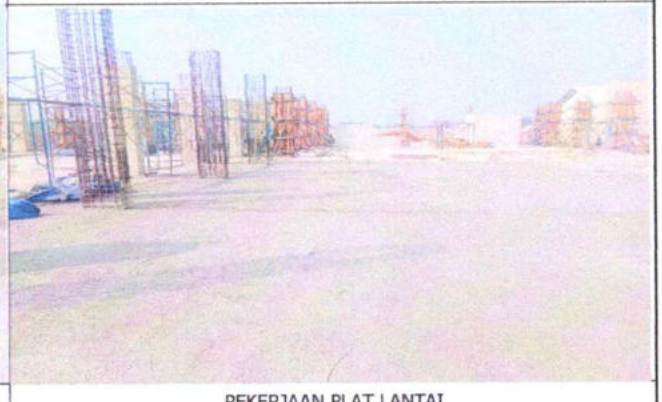


PEKERJAAN PLAT LANTAI



PEKERJAAN GWT



KUNJUNGAN LAPANGAN TIM TEKNIS

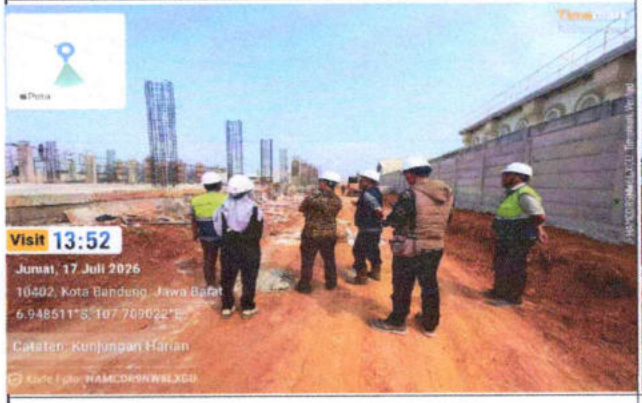

KUNJUNGAN LAPANGAN TIM TEKNIS



KUNJUNGAN LAPANGAN TIM TEKNIS

Hari	: Kamis
Tanggal	: 16/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI

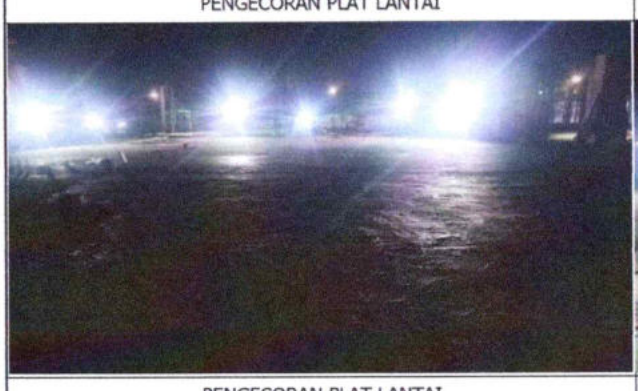

PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI




PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN KOLOM



PENGECORAN KOLOM

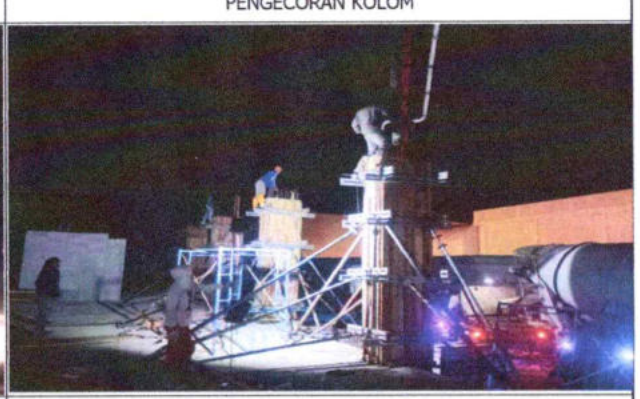

PENGECORAN KOLOM

Hari	: Kamis
Tanggal	: 16/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



SLUMP TEST



PENGECORAN KOLOM UTILITAS

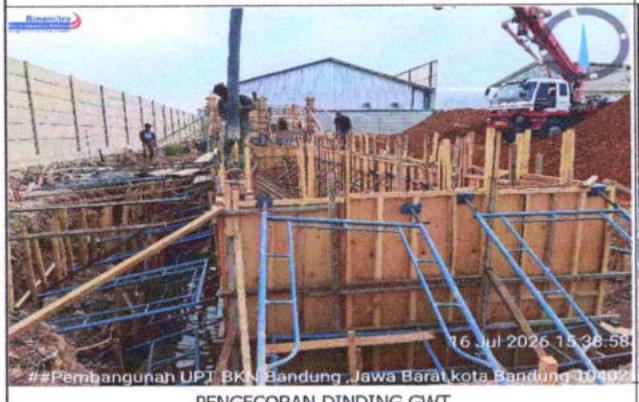

PENGECORAN DINDING GWT



PENGECORAN DINDING GWT



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI




PENGECORAN PLAT LANTAI

Hari	: Rabu
Tanggal	: 15/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN

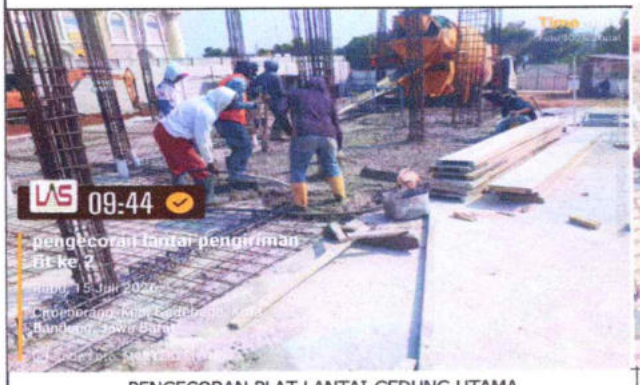

PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTAMA



PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTAMA



PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTAMA



PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTAMA




WIREMESH PLAT LANTAI GEDUNG UTILITAS



PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTILITAS



PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTILITAS

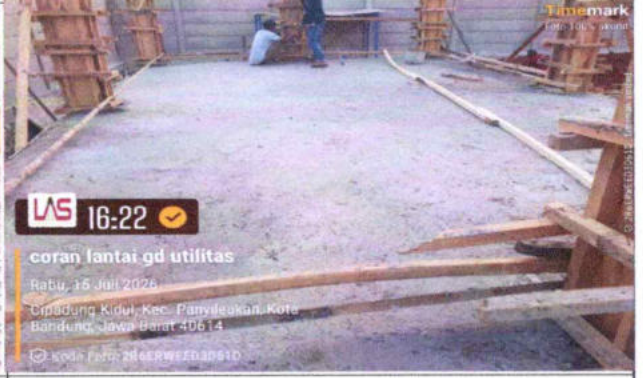


PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTILITAS

Hari	: Rabu
Tanggal	: 15/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN

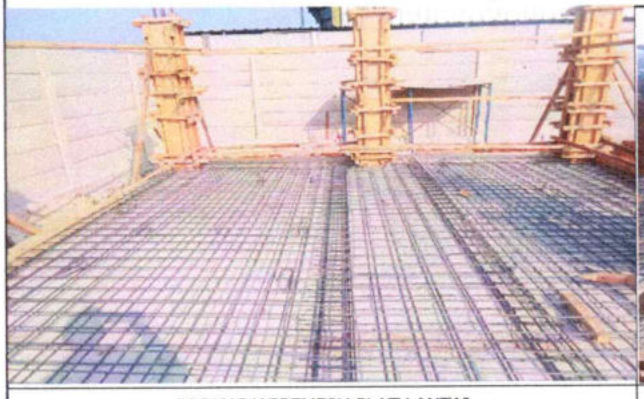

PASANG WIREMESH PLAT LANTAI




PASANG WIREMESH PLAT LANTAI



PASANG WIREMESH PLAT LANTAI



PASANG WIREMESH PLAT LANTAI

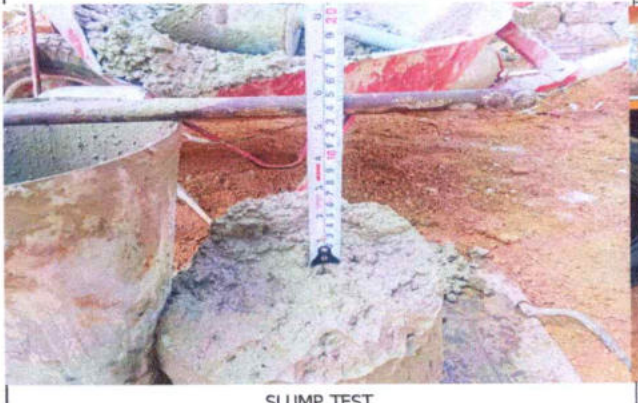

SLUMP TEST



SLUMP TEST



PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTAMA




PENGECORAN PLAT LANTAI GEDUNG UTAMA

BKN / Binamitra Bangunsarana Pratama / LAS		Hari : Selasa Tanggal : 14/7/2026 Minggu ke : 13 (Tigabelas)
Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026 Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung		Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




PASANG WIREMESS PLAT LANTAI

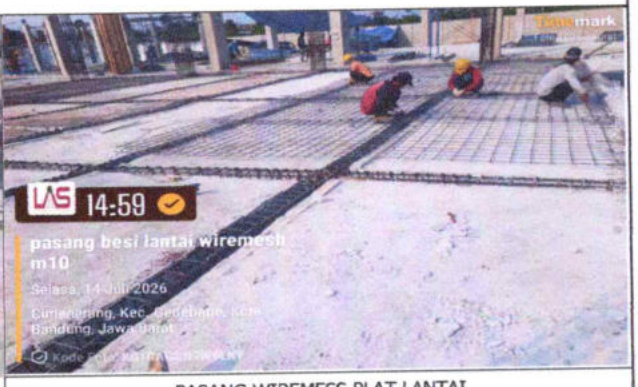

PASANG WIREMESS PLAT LANTAI





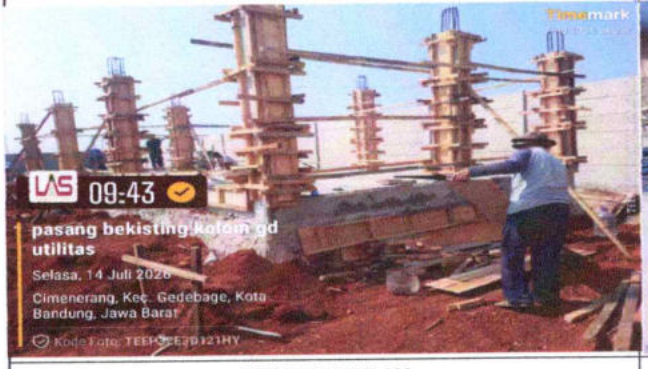

BEKESTING KOLOM



PENGECEKAN ELEVASI KOLOM



LANTAI KERJA PLAT LANTAI



LANTAI KERJA PLAT LANTAI

Hari	: Selasa
Tanggal	: 14/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING GWT



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PEMBESIAN KOLOM



LANTAI KERJA PLAT LANTAI



LANTAI KERJA PLAT LANTAI



PASANG WIREMESS PLAT LANTAI



PASANG WIREMESS PLAT LANTAI


Hari	: Senin
Tanggal	: 13/7/2026
Minggu ke	: 13 (Tigabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




PERATAAN TANAH

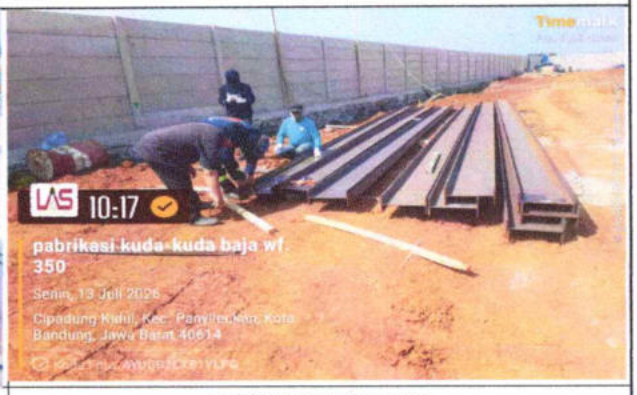

PEBRIKASI RANGKA BAJA



URUGAN PASIR

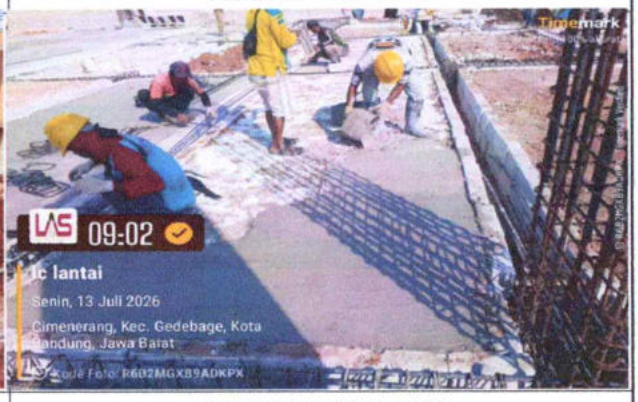

LANTAI KERJA PLAT LANTAI



PEMBESIAN SLOOF



PEBRIKASI KOLOM



PEBRIKASI KOLOM



PEBRIKASI KOLOM

BKN / Binamitra Bangunsarana Pratama / LAS		Hari : Minggu Tanggal : 12/7/2026 Minggu ke : 12 (Duabelas)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



LANTAI KERJA SLOOF



LANTAI KERJA PLAT LANTAI

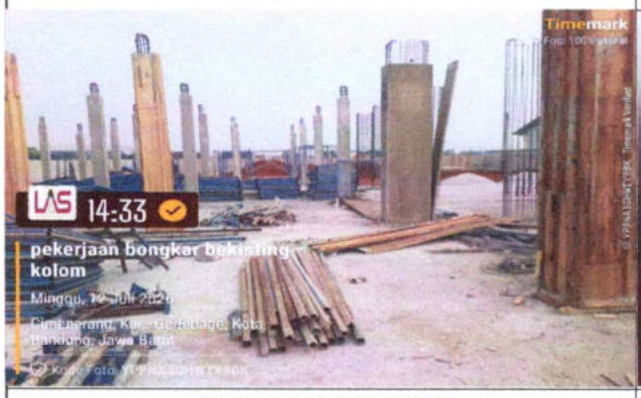

BONGKAR BEKESTING KOLOM



BONGKAR BEKESTING KOLOM



PASANG SKAPOLDING



PERATAAN TANAH



PASANG HEBEL BEKETING SLOOF



PASANG HEBEL BEKETING SLOOF

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 11/7/2026
Minggu ke	: 12 (Duabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



PASANGAN HEBEL BEKETING SLOOF



PEMBESIAN SLOOF

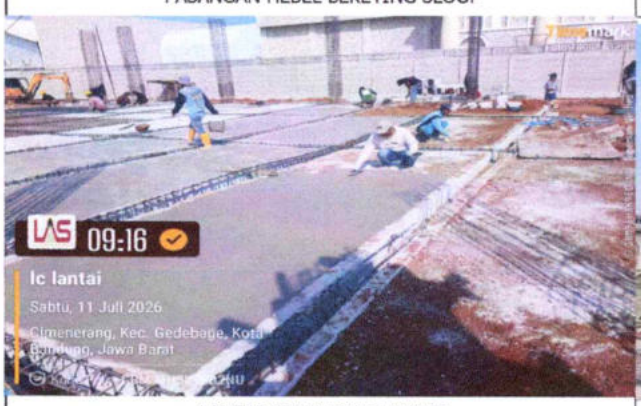

LANTAI KERJA PLAT LANTAI



PENGECORAN KOLOM



PENGECORAN KOLOM



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI

Hari	: Jum,at
Tanggal	: 10/7/2026
Minggu ke	: 12 (Duabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



PASANG HEBEL BEKETING SLOOF



PASANG WIREMESH PLAT LANTAI

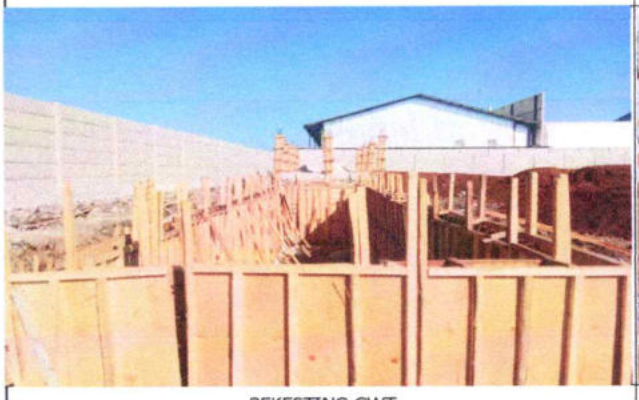

BEKESTING GWT



PEMBESIAN SLOOF



BEKESTING KOLOM



BEKESTING KOLOM



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH

Hari	: Kamis
Tanggal	: 9/7/2026
Minggu ke	: 12 (Duabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PERATAAN DAN PEMDATAN TANAH



PERATAAN DAN PEMDATAN TANAH



PASANG BEKETING KOLOM



PASANGAN HEBEL BEKESTING SLOOF



LANTAI KERJA PLAT LANTAI



BEKESTING KOLOM



PLUMBING AIR KOTOR & BEKAS



PLUMBING AIR KOTOR & BEKAS

Hari : Rabu
Tanggal : 8/7/2026
Minggu ke : 12 (Duabelas)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING KOLOM



URUGAN PASIR



URUGAN PASIR



PEMBESIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF



GALIAN PONDASI SLOOF



PASANGAN HEBEL BEKESTING SLOOF



PASANGAN HEBEL BEKESTING SLOOF

Hari	: Selasa
Tanggal	: 7/7/2026
Minggu ke	: 12 (Duabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING PASANGAN HEBEL




PEMBESIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF



LANTAI KERJA SLOOF

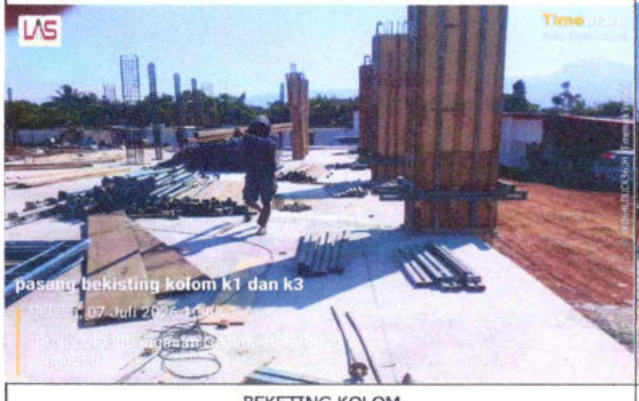

BEKETING KOLOM



BEKETING KOLOM



PEBRIKASI BEKESTING GWT



PASANG BEKETING GWT

Hari	: Senin
Tanggal	: 6/7/2026
Minggu ke	: 12 (Duabelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF



URUGAN PASIR



GALIAN PONDASI



PERATAAN TANAH



BEKETIG GWT



BEKETING KOLOM




LANTAI KERJA SLOOF

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

Hari : Senin
Tanggal : 6/7/2026
Minggu ke : 12 (Duabelas)

DOKUMENTASI HARIAN

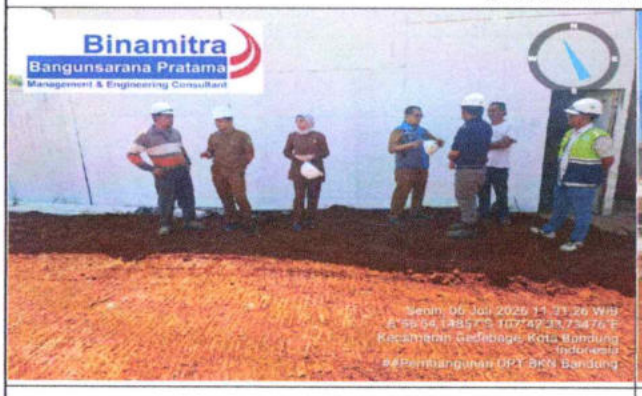

TINJAUAN TIM TEKNIS KE LAPANGAN



TINJAUAN TIM TEKNIS KE LAPANGAN



TINJAUAN TIM TEKNIS KE LAPANGAN



TINJAUAN TIM TEKNIS KE LAPANGAN



PERATAAN TANAH



BEKESTING KOLOM



BEKESTING PASANGAN HEBEL



BEKESTING PASANGAN HEBEL

Hari : Minggu Tanggal : 5/07/2026 Minggu ke : 11 (Sebelas)	

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



LANTAI KERJA PLAT LANTAI



PEMBESIAN SLOOF

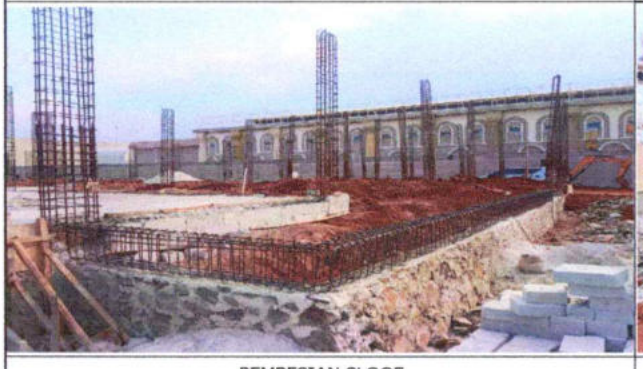

PEMBESIAN SLOOF



BEKESTNG PLAT LANTAI



BEKESTNG PLAT LANTAI



BEKESTING KOLOM



PEKERJAAN PLAT LANTAI



PEKERJAAN KOLOM K.3


	Hari : Minggu Tanggal : 5/07/2026 Minggu ke : 11 (Sebelas)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PERATAAN TANNAH

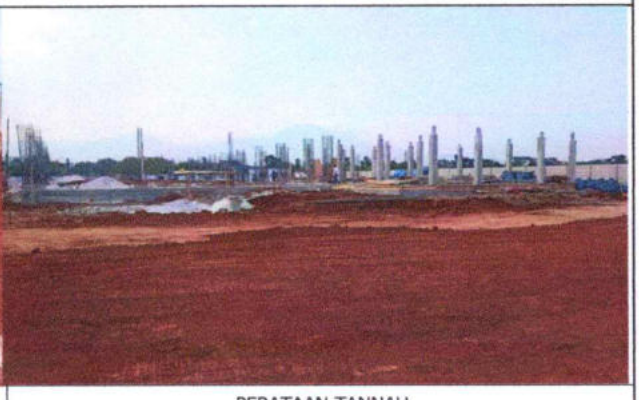

PERATAAN TANNAH



BEKESTING GWT



GALIAN MANUAL PONDASI SLOOF



PASANGAN HEBEL PONDASI SLOOF



PASANGAN HEBEL PONDASI SLOOF



PEMBESIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF

Hari : Sabtu Tanggal : 4/07/2026 Minggu ke : 11 (Sebelas)	

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN GWT



PERATAAN TANAH

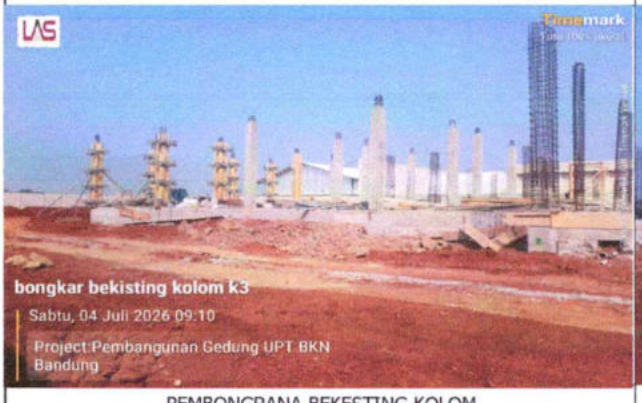

PEMBONGRANA BEKESTING KOLOM




PEMBESIAN KOLOM



PEMBESIAN KOLOM



BEKETING KOLOM

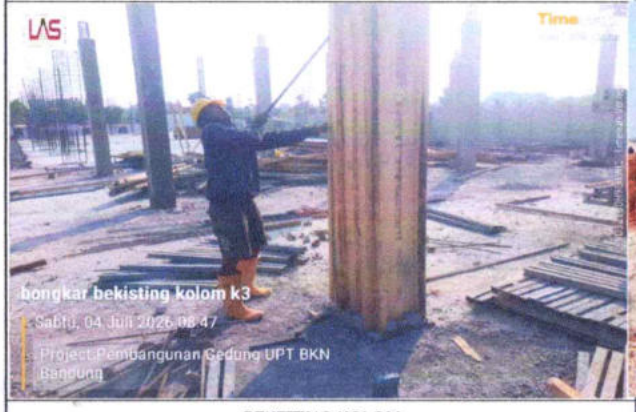

BEKETING KOLOM



PONDASI PASANGAN BATU

Hari	: Jum,at
Tanggal	: 3/07/2026
Minggu ke	: 11 (Sebelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PERATAAN TANAH



PONDASI PASANGAN BATU



PEMBESIAN KOLOM



PONDASI PASANGAN BATU



BONGKAR BEKESTING KOLOM



PEMBESIAN GWT



BONGKAR BEKESTING KOLOM



BONGKAR BEKESTING KOLOM

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	2/07/2026
Minggu ke	:	11 (Sebelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN PILECAP UTILITAS



PEMBESIAN PILECAP UTILITAS




SLUMP TEST



SLUMP TEST



PENGECORAN PLAT LANTAI

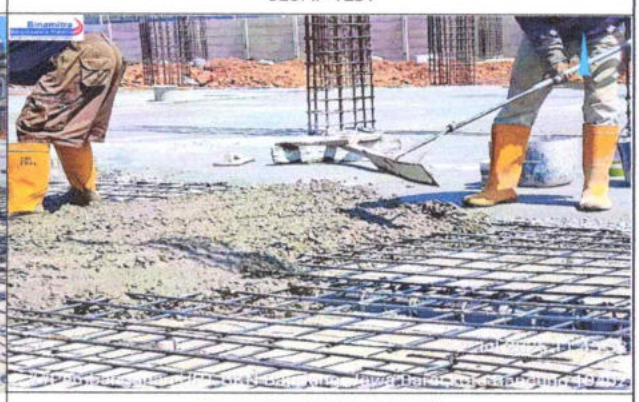

PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI


Hari : Rabu
Tanggal : 1/07/2026
Minggu ke : 11 (Sebelas)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PENGECORAN KOLOM

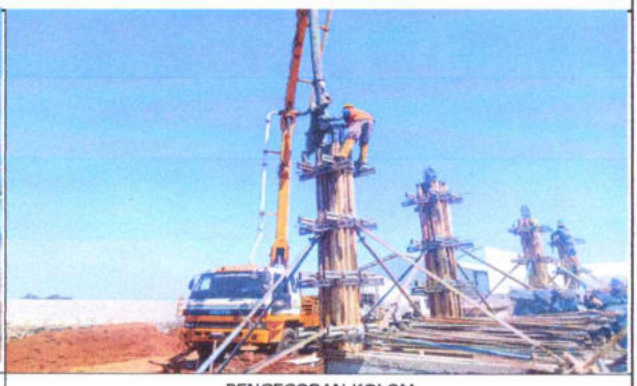

PENGECORAN KOLOM



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI



PENGECORAN PLAT LANTAI

Hari	: Rabu
Tanggal	: 1/07/2026
Minggu ke	: 11 (Sebelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




KUNJUNGAN LAPANGAN KEKANREG III BANDUNG



KUNJUNGAN LAPANGAN KEKANREG III BANDUNG




PEK WIREMESS PLAT LANTAI

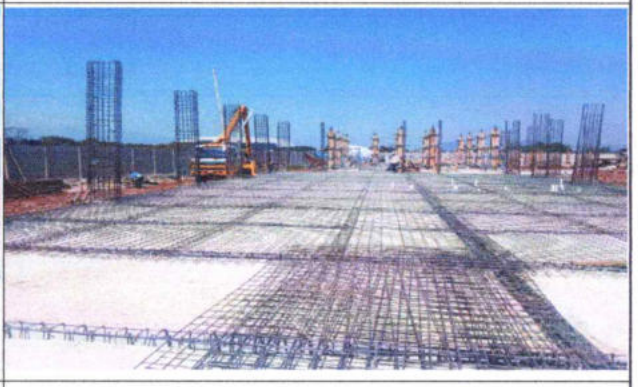

PEK WIREMESS PLAT LANTAI



PENGECORAN KOLOM

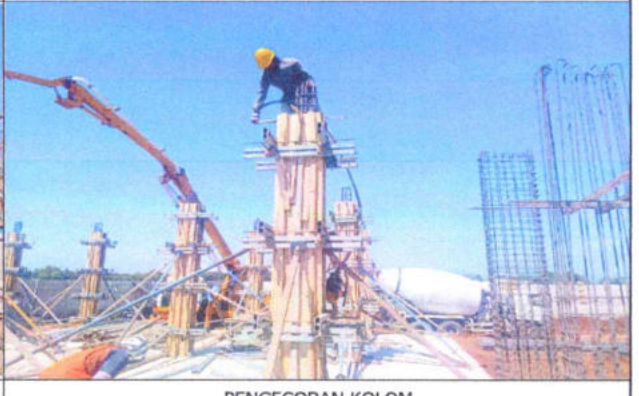

PENGECORAN KOLOM



PENGECORAN KOLOM



PENGECORAN PLAT LANTAI

Hari	: Selasa
Tanggal	: 30/06/2026
Minggu ke	: 11 (Sebelas)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



TIMBUNAN TANAH



TIMBUNAN TANAH




TIMBUNAN TANAH



URUGAN PASIR



LANTAI KERJA PLAT LANTAI

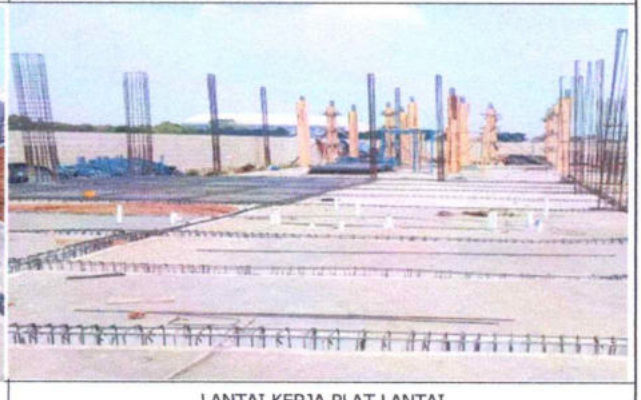

LANTAI KERJA PLAT LANTAI



PEMASANGAN WIREMESS PLAT LANTAI



PEMASANGAN WIREMESS PLAT LANTAI

Hari	: Senin
Tanggal	: 29/06/2026
Minggu ke	: 11 (Sebelas)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING SLOOF



PEMBESIAN SLOOF

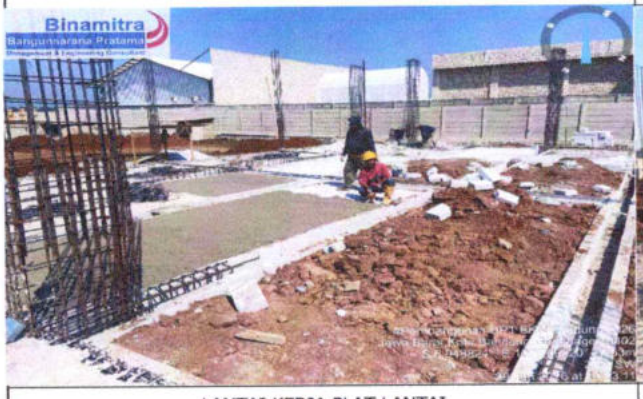

LANTAI KERJA PLAT LANTAI



PASANG WIREMESS PLAT LANTAI



TIMBUNAN TANAH



TIMBUNAN TANAH



BEKESTING KOLOM




BEKESTING KOLOM

Hari	: Minggu
Tanggal	: 28/06/2026
Minggu ke	: 10 (Sepuluh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN

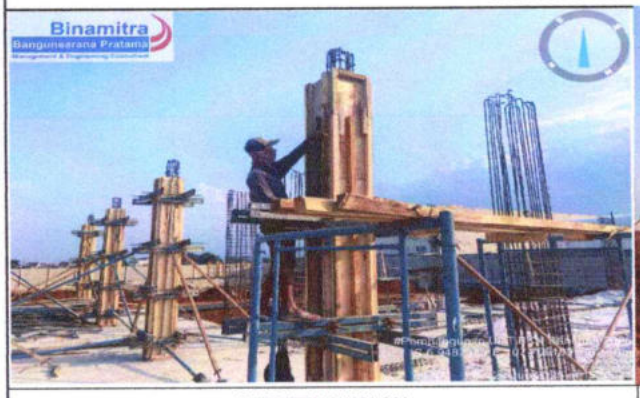

BEKESTING KOLOM



BEKESTING KOLOM



PEKERJAAN PEMASANGANPEMBESIAN WIREMES LANTAI




PEKERJAAN PEMASANGANPEMBESIAN WIREMES LANTAI



PEKERJAAN PLUMBING PIPA AIR BEKAS DAN KOTOR



PEKERJAAN PLUMBING PIPA AIR BEKAS DAN KOTOR

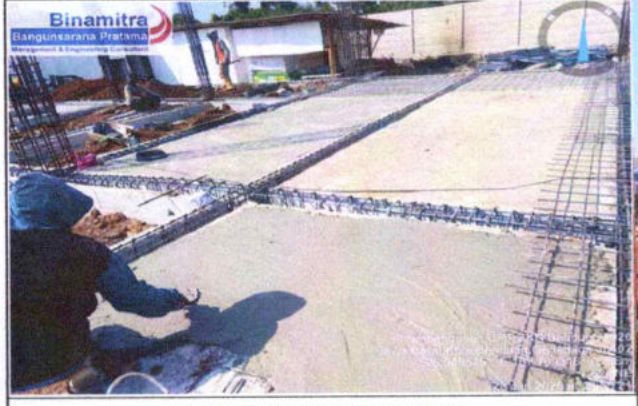

COR LANTAI KERJA PLAT LANTAI



TIMBUNAN TANAH

	Hari : Sabtu Tanggal : 27/06/2026 Minggu ke : 10 (Sepuluh)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN




PEMASANGAN WIREMESH




PEMASANGAN WIREMESH

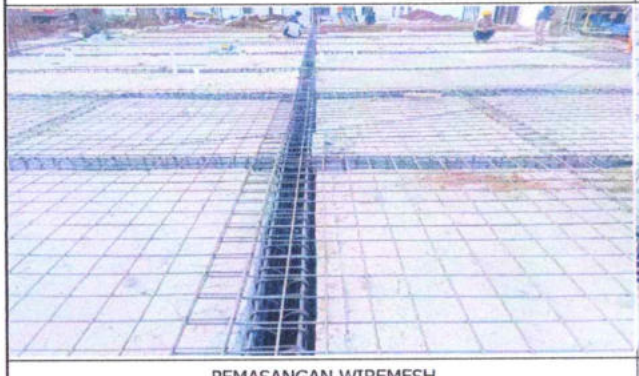


PEMASANGAN WIREMESH

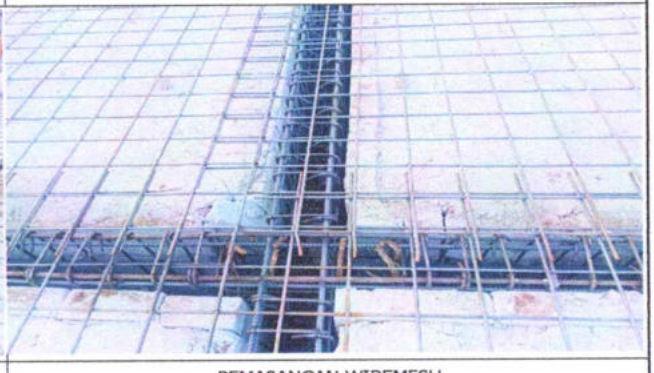

PEMASANGAN WIREMESH

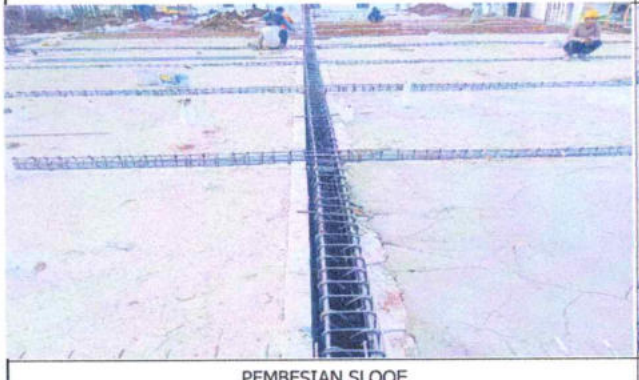

PEMBESIAN SLOOF

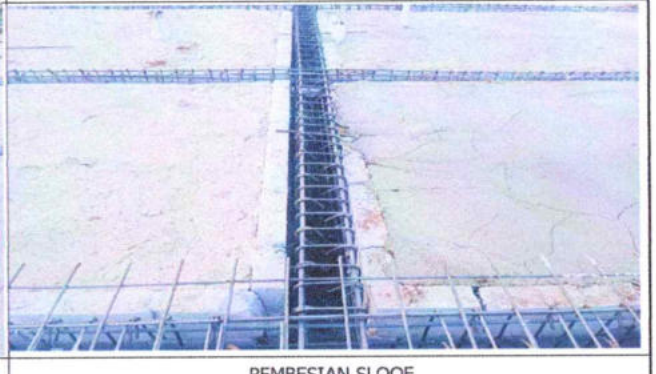

PEMBESIAN SLOOF



URUGAN PASIR LANTAI



LANTAI KERJA PLAT LANTAI

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 27/06/2026
Minggu ke	: 10 (Sepuluh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEKERJAAN BEKESTING KOLOM



LANTAI KERJA PLAT LANTAI



URUGAN TANAH



PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS



PEMBESIAN SLOOF



PASANGAN HEBEL BEKETING SLOOF



PEMASANGAN WIREMESH



PEMASANGAN WIREMESH


Hari	: Jum,at
Tanggal	: 26/06/2026
Minggu ke	: 10 (Sepuluh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEKERJAAN BEKESTING KOLOM

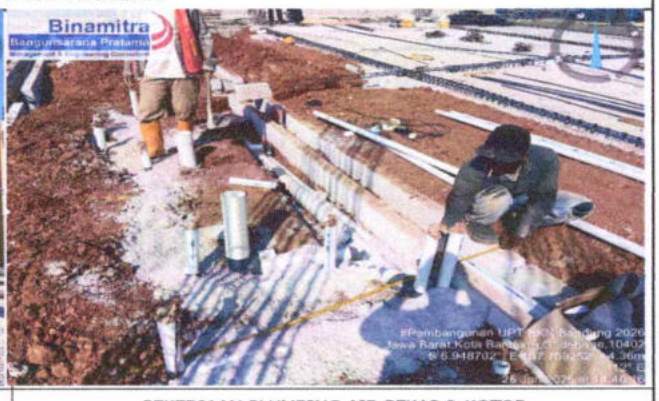

PEKERJAAN PLUMBING AIR BEKAS & KOTOR



PEMBESIAN KOLOM



PERATAAN TANAH




PASANGAN HEBEL PONDASI SLOOF



PEKERJAAN LANTAI KERJA PONDASI SLOOF



KUNJUNGAN LAPANGAN TIM TEKNIS

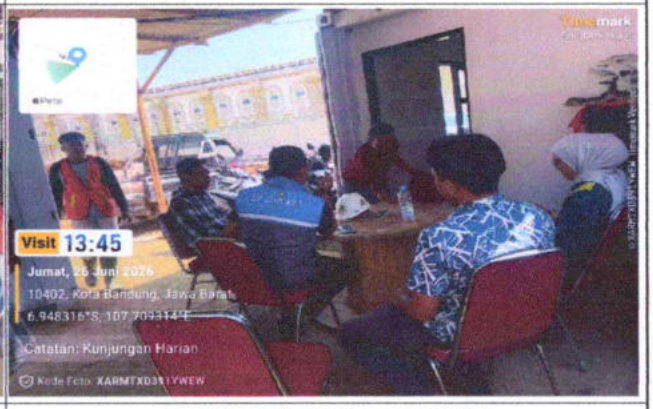

KUNJUNGAN LAPANGAN TIM TEKNIS

Hari	: Kamis
Tanggal	: 25/06/2026
Minggu ke	: 10 (Sepuluh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN KOLOM K1



PEMBESIAN KOLOM K1



PEMBESIAN KOLOM K1



PEMBESIAN KOLOM K1



PEMBESIAN KOLOM K1



PEMBESIAN KOLOM K1



PEMBESIAN KOLOM K1,K,2, K3



PEMBESIAN KOLOM K1,K,2, K3

Hari	: Kamis
Tanggal	: 25/06/2026
Minggu ke	: 10 (Sepuluh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



GALIAN TANAH SLOOF



URUGAN PASIR SLOOF



LANTAI KERJA SLOOF



BEKESTING SLOOF



BEKESTING SLOOF



PERATAAN TANAH



BEKESTING KOLOM

Hari	: Rabu
Tanggal	: 24/06/2026
Minggu ke	: 10 (Sepuluh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN PILECAP UTILITAS



BEKESTING SLOOF



BEKESTING KOLOM



PEMBERSIHAN LOKASI



URUGAN PASIR



PERATAAN TANAH



BEKESTING KOLOM



PENGADAAN ESCAPOLDING

	Hari : Selasa Tanggal : 23/06/2026 Minggu ke : 10 (Sepuluh)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PENGECORAN LANTAI



PENGECORAN LANTAI



BEKESTING KOLOM UTILITAS



URUGAN PASIR SLOOF



LANATAI KERJA SLOOF



BEKESTING SLOOF



LANATAI KERJA SLOOF



PENGECORAN SLOOF

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

Hari : Selasa
Tanggal : 23/06/2026
Minggu ke : 10 (Sepuluh)

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



BEKETING GWT



GALIAN SLOOF



GALIAN SLOOF



PERATAAN TANAH



PEMADATAN TANAH





Hari	: Senin
Tanggal	: 22/06/2026
Minggu ke	: 10 (Sepuluh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



GALIAN SLOOF



GALIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF



PERATAAN TANAH



BEGESTING CWT



KOORDINASI LAPANGAN



KOORDINASI LAPANGAN

Hari	: Minggu
Tanggal	: 21/06/2026
Minggu ke	: 9 (Sembilan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



BEGESTING DINDING GWT



PEKERJAAN PLUMBING AIR KOTOR & BEKAS



PEKERJAAN PLUMBING AIR KOTOR & BEKAS




PEMASANGAN WIREMESH



PEMBESIAN KOLOM



PENGECORAN LANTAI

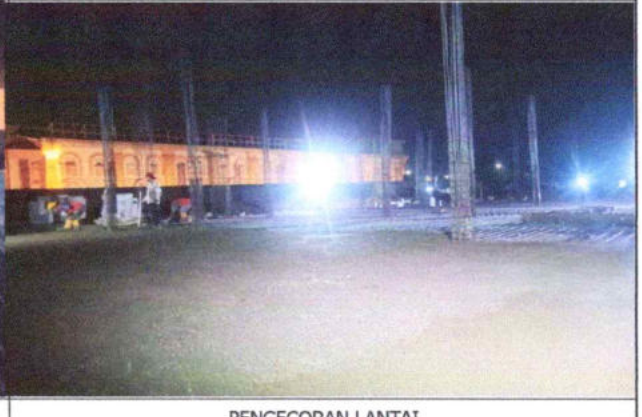

PENGECORAN LANTAI

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 20/06/2026
Minggu ke	: 9 (Sembilan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



PEMBESIAN PILECAP



PEKERJAAN PLUMBING AIR KOTOR & BEKAS



PEKERJAAN PLUMBING AIR KOTOR & BEKAS



LANTAI KERJA SLOOF



LANTAI KERJA SLAB



PEMASANGAN WIREMESH




PEMASANGAN WIREMESH

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

Hari : Jum'at
Tanggal : 19/06/2026
Minggu ke : 9 (Sembilan)


DOKUMENTASI HARIAN

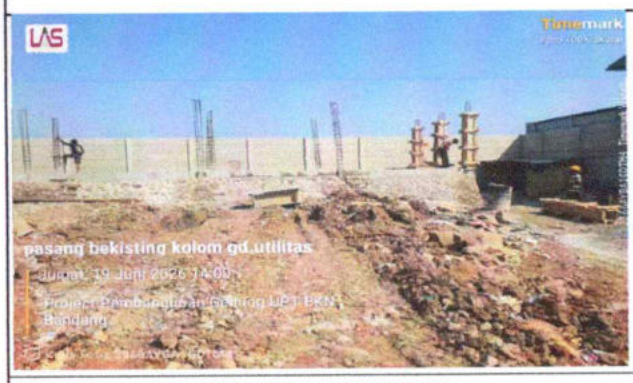

BEKESTING KOLOM UTILITAS




BEKESTING KOLOM UTILITAS

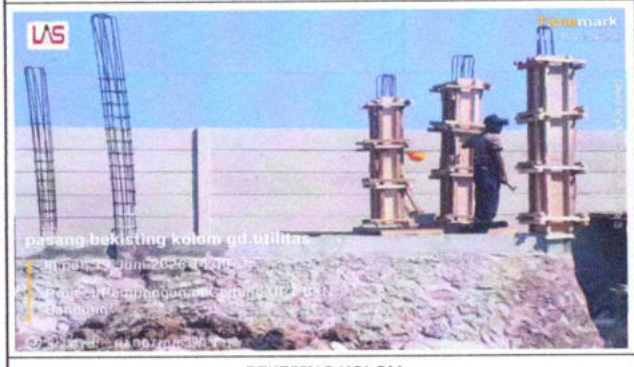

BEKESING KOLOM



PENGECORAN SLOOF TYPE S1

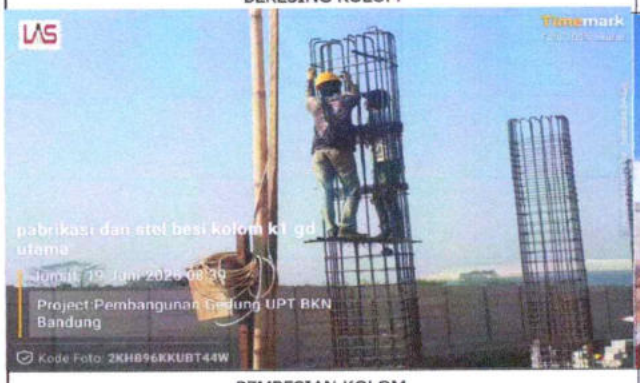

PEMBESIAN KOLOM



PEMBESIAN KOLOM



KOORDNASI LAPANGAN DENGAN TIM TEKNIS



KOORDNASI LAPANGAN DENGAN TIM TEKNIS

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 19/06/2026
Minggu ke	: 9 (Sembilan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



PEMBESIAN DINDING GWT



PERATAAN DAN PEMADATAN TANAH



PERATAAN DAN PEMADATAN TANAH



BEKESTING HEBEL SLOOF



LANTAI KERJA SLAB



PEMBESIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF

Hari	: Kamis
Tanggal	: 18/06/2026
Minggu ke	: 9 (Sembilan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



PEMBESIAN SLOOF



PEMADATAN TANAH TIMBUNAN




PEMADATAN TANAH TIMBUNAN




PENGUJIAN CBR



PENGUJIAN CBR

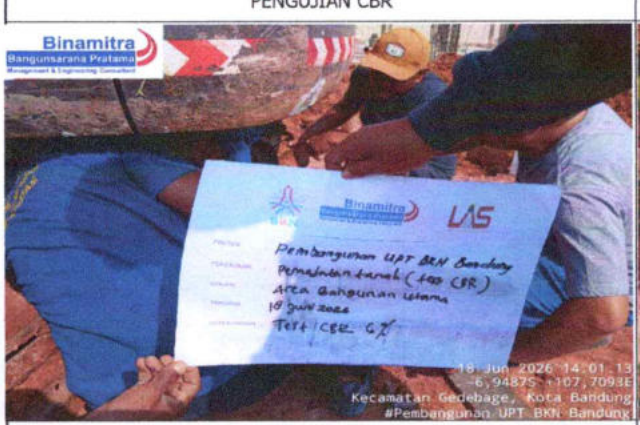

PENGUJIAN CBR

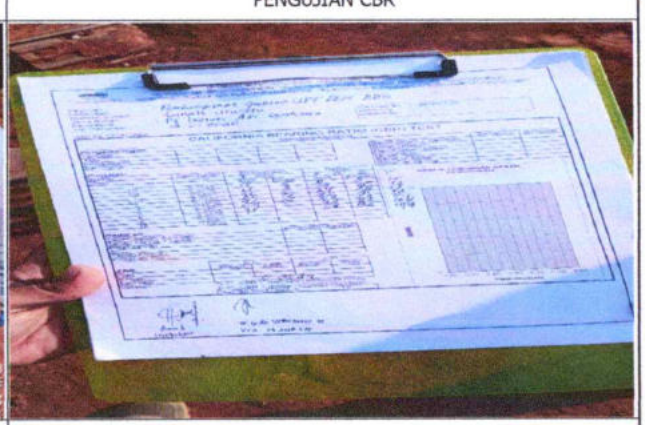

DATA HASIL PENGUJIAN CBR


Hari	: Rabu
Tanggal	: 17/06/2026
Minggu ke	: 9 (Sembilan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




SAFETYMORNING

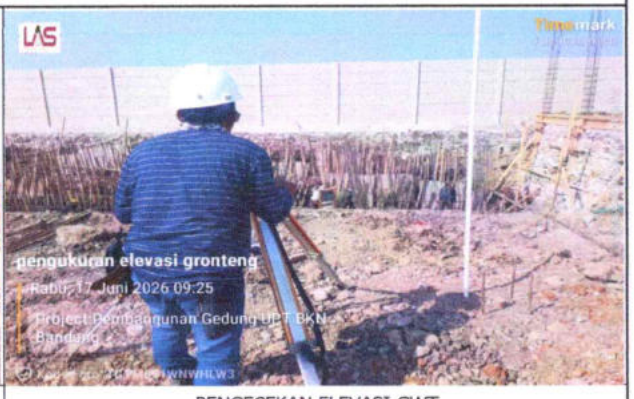

PENGECEKAN ELEVASI GWT



PEMADATAN TIMBUNAN

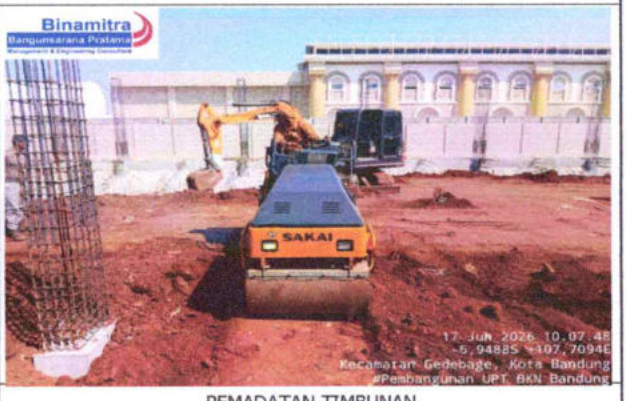

PEMADATAN TIMBUNAN



PEMBESIAN KOLOM



PENGECORAN SLOOF UTILITAS



PENGECORAN GWT



PENGECORAN GWT

Hari	: Selasa
Tanggal	: 16/06/2026
Minggu ke	: 9 (Sembilan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING HEBEL SLOOF




PEMADATAN TIMBUNAN



PEMBESIAN DINDING GWT



PEMBESIAN DINDING GWT

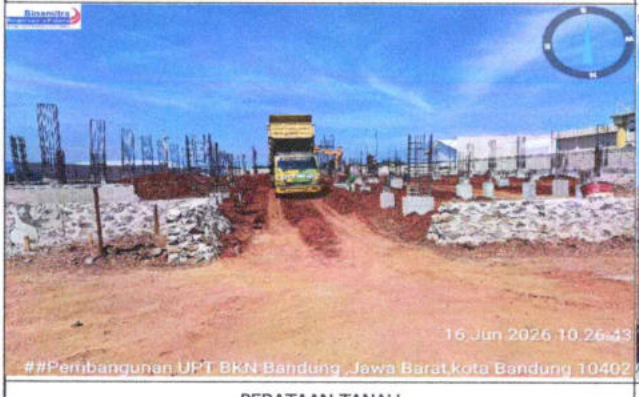

PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PEMBESIAN KOLOM



MOB ALAT PEMADAT

Hari	:	Senin
Tanggal	:	15/06/2026
Minggu ke	:	9 (Sembilan)

Pekeriaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	: 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING SLOOF UTILITAS



PEMBESIAN DINDING GWT




PEMBESIAN KOLOM



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH

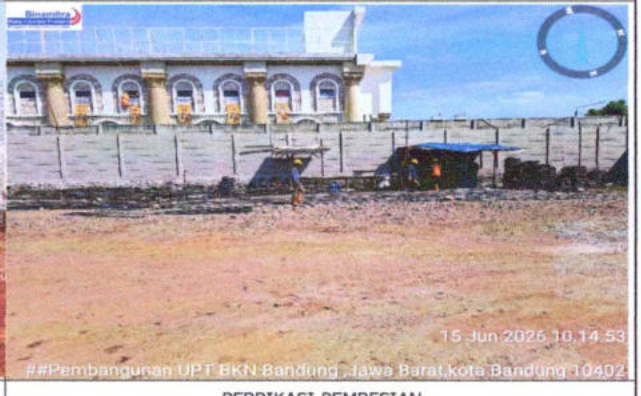

PEBRIKASI PEMBESIAN



BEKESTING HEBEL SLOOF



PEMADATAN TIMBUNAN

Hari	: Minggu
Tanggal	: 14/06/2026
Minggu ke	: 8 (Delapan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



PEMBUSIAN KOLOM




PEMBESIAN KOLOM

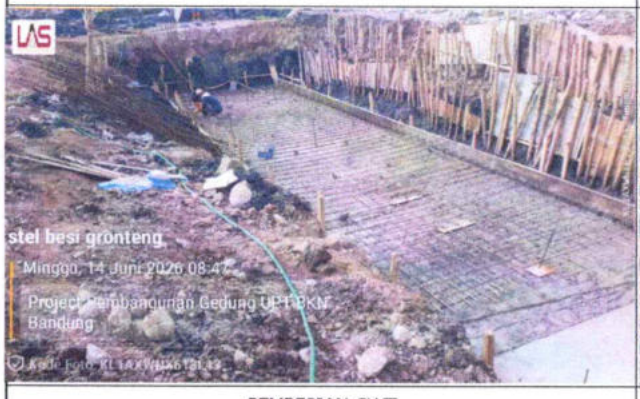


PEMBESIAN GWT



PEMBESIAN GWT

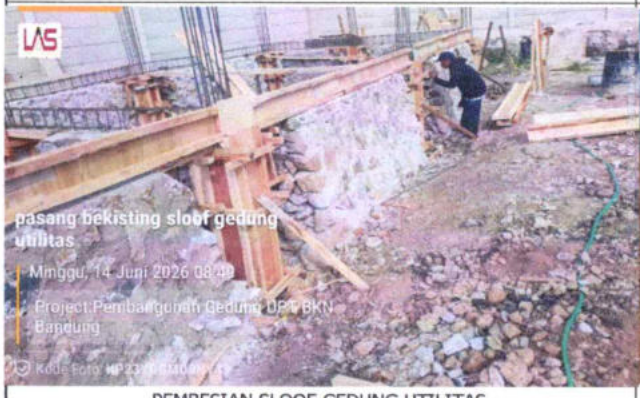

PEMBESIAN SLOOF GEDUNG UTILITAS

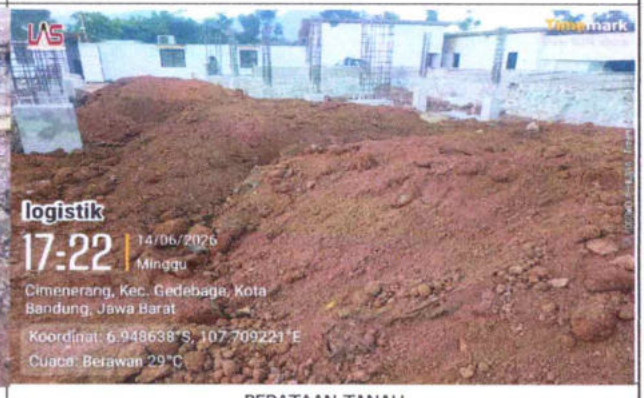

PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 13/06/2026
Minggu ke	: 8 (Delapan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PERATAAN TANAH



PEMBESIAN KOLOM



PEMBESIAN KOLOM



BEKESTING SLOOF S1



PEMBONGKARAN BEKESTING SLOOF S1



PEKERJAAN SLOOF S1



PEMBESIAN KOLOM



PEMBESIAN KOLOM

Hari	: Kamis
Tanggal	: 11/06/2026
Minggu ke	: 8 (Delapan)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksan : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawa: : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PERATAAN TANAH



KOLOM PEDESTAL K2




KOLOM PEDESTAL K3




SLOOF S1



PENGECORAN SLOOF

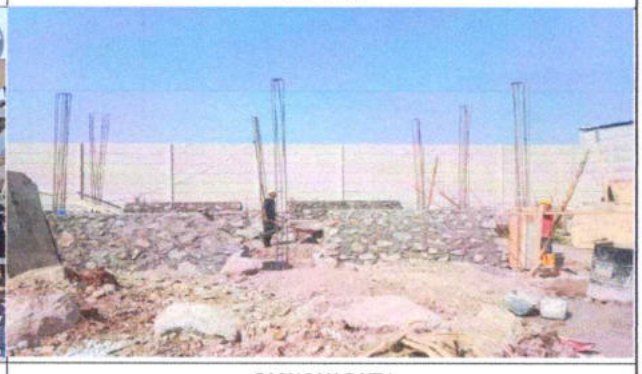

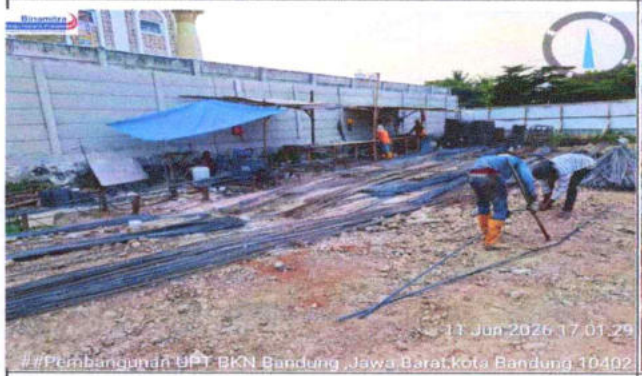

PENGECORAN SLOOF



PERATAAN TANAH

Hari : Kamis
Tanggal : 11/06/2026
Minggu ke : 8 (Delapan)


Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

Kontraktor Pelaksan : PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawa: : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING

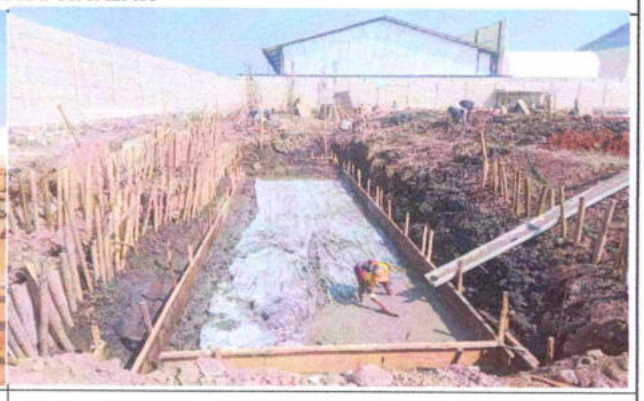

LANTAI KERJA GWT



PENGECORAN LANTAI GWT



PENGECORAN SLOOF



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	10/06/2026
Minggu ke	:	8 (Delapan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



KUNJUNGAN LAPANGAN TIM TEKNIS



KUNJUNGAN LAPANGAN TIM TEKNIS



PENGECORAN SLOOF TYPE S1



PENGECORAN SLOOF TYPE S1



BEKESTING SLOOF S1



BEKESTING PEDESTAL



PENGECORAN SLOOF



PENGECORAN SLOOF

Hari	: Selasa
Tanggal	: 9/06/2026
Minggu ke	: 8 (Delapan)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PEMBESIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF



BEKESTING SLOOF



BEKESTING SLOOF

Hari	: Minggu
Tanggal	: 07/06/2026
Minggu ke	: 7 (Tujuh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN




GALIAN GWT




PEMBESIAN KOLOM

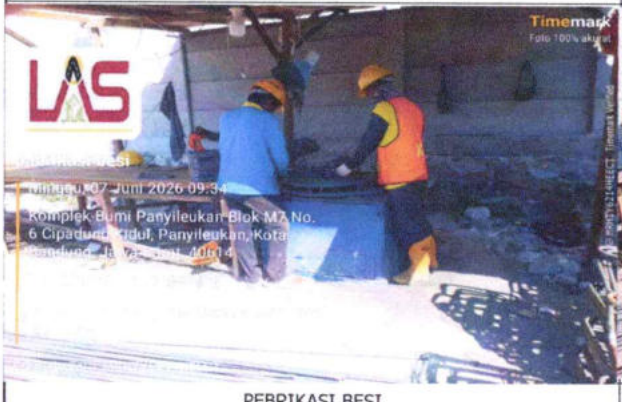

PEBRIKASI BESI

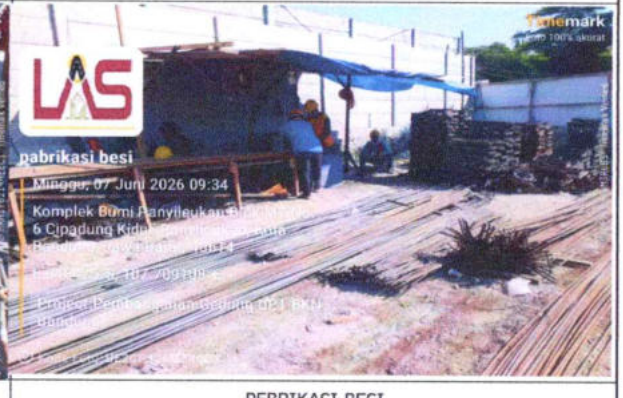

PEBRIKASI BESI

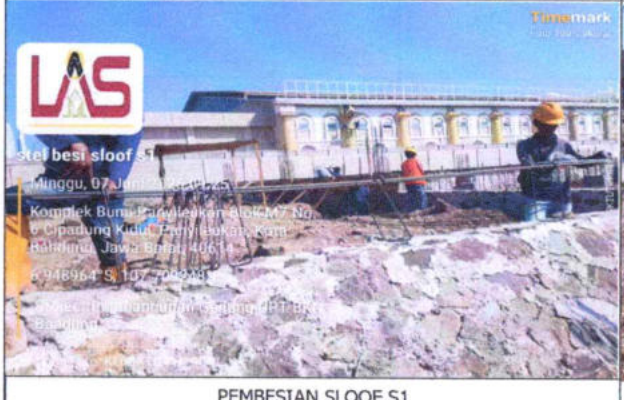


PEMBESIAN SLOOF S1



PEMBESIAN SLOOF S1



BEKESTING SLOOF S 1

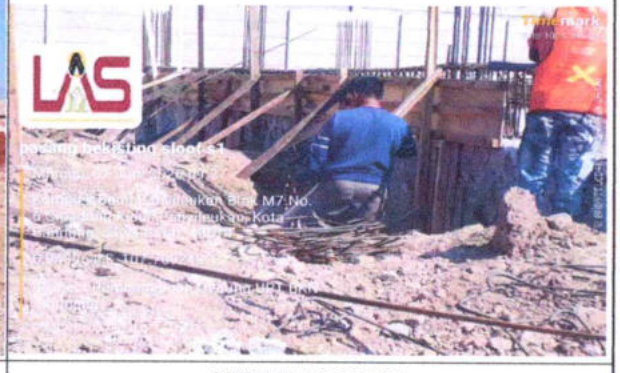

BEKESTING SLOOF S 1

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 06/06/2026
Minggu ke	: 7 (Tujuh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



SAFETY MORNING



PENGECORAN KOLOM PEDESTAL




PENGECORAN KOLOM PEDESTAL



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH

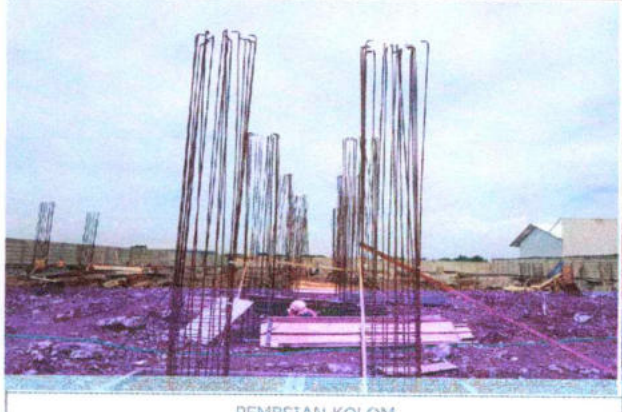

PEMBSIAN KOLOM



BEKESTING KOLOMPEDESTAL

Hari	: Jum;at
Tanggal	: 05/06/2026
Minggu ke	: 7 (Tujuh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



KUNJUNGAN TIM TEKNIS




KUNJUNGAN TIM TEKNIS



PENGECORAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN SLOOF

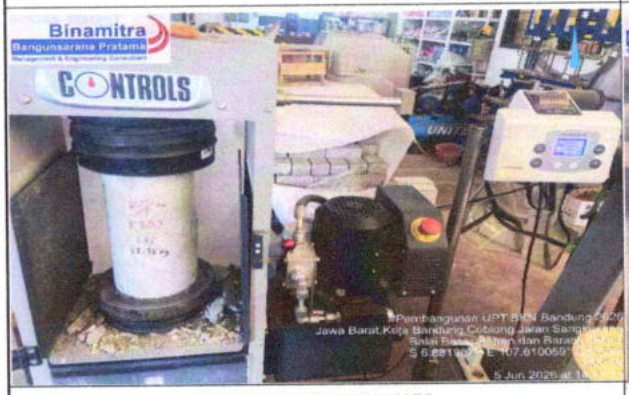

UJI TEKAN UMUR 10 HARI



UJI TEKAN UMUR 10 HARI



PEMBESIAL KOLOM



PONDASI PASANGAN BATU

Hari : Kamis
Tanggal : 04/06/2026
Minggu ke : 7 (Tujuh)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




SAFETY MORNING



PEBRIKASI BESI



PEMBESIAN PILECAP

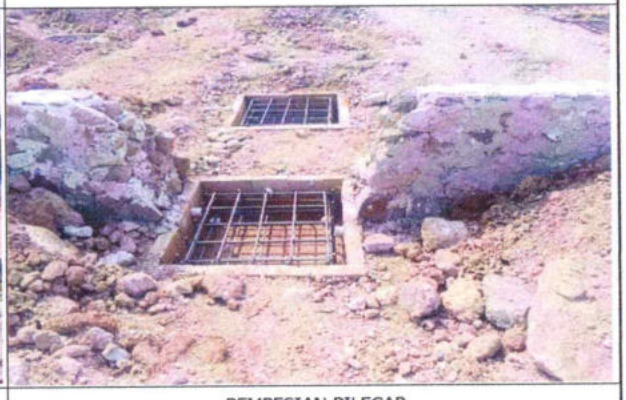

PEMBESIAN PILECAP



PENGECORAN PILECAP



BEKESTING KOLOM PEDESTAL



BEKESTING KOLOM PEDESTAL




BEKESTING KOLOM PEDESTAL

Hari	: Rabu
Tanggal	: 03/06/2026
Minggu ke	: 7 (Tujuh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN

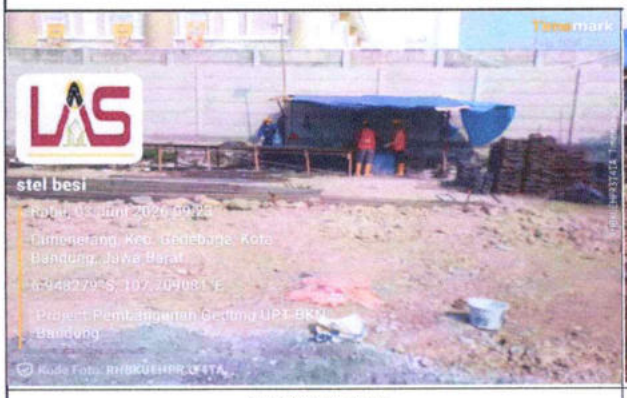

PEBRIKASI BESI



BEKESTING KOLOM PEDESTAL



PASANGAN BATU



PEMBESIAN SLOOF



PEMBESIAN SLOOF



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH



PERATAAN TANAH

Hari	: Selasa
Tanggal	: 2/06/2026
Minggu ke	: 7 (Tujuh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



PONMDASI PASANGAN BATU



TEST SLUMP



PENGECORAN PILECAP



PENGECORAN PILECAP



PENGECORAN SLOOF PAGAR



PENGECORAN KOLOM PEDESTAL



PENGECORAN KOLOM PEDESTAL

Hari	: Senin
Tanggal	: 01/06/2026
Minggu ke	: 7 (Tujuh)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



EXSISTING




GALIAN GWT

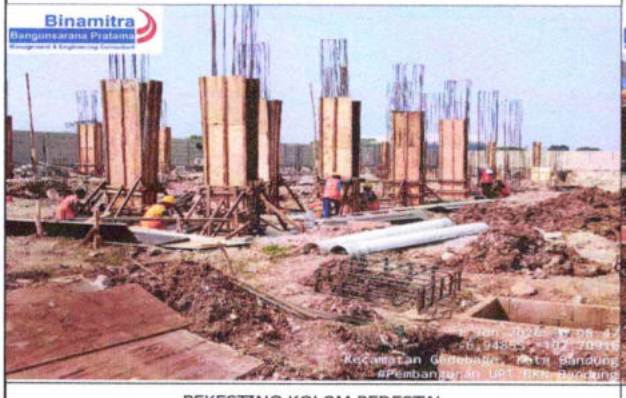

BEKESTING KOLOM PEDESTAL



URUGAN PASIR PONDASI PASANGAN BATU

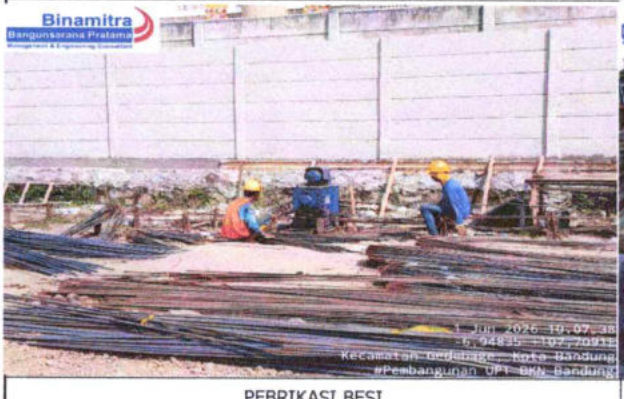

PEBRIKASI BESI



PEBRIKASI BEKESTING



PASANGAN PONDASI PASANGAN BATU



PENGECORAN PEDESTAL

Hari	: Minggu
Tanggal	: 31/05/2026
Minggu ke	: 6 (Enam)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



BKESTING HEBEL PILECAP




GALIAN GWT



BKESTING HEBEL PILECAP



PEMBESIAN SLOOF PAGAR PANEL

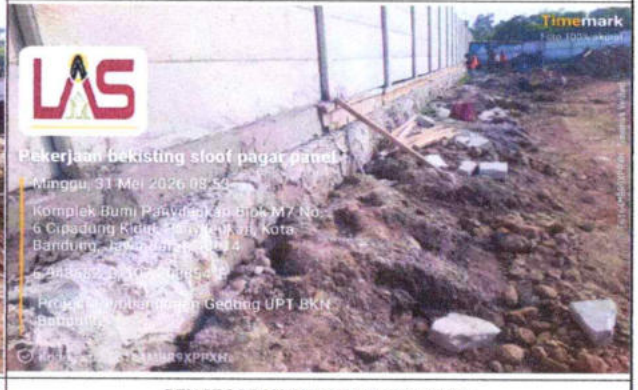

PENGECORAN SLOOF PAGAR PANEL



CEK ELEVASI PONDASI PILECAP



URUGAN PONDASI PLECAP

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 30/05/2026
Minggu ke	: 6 (Enam)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




PEMBESIAN PILECAP



BEKESTING KOLOM



GALIAN PILECAP

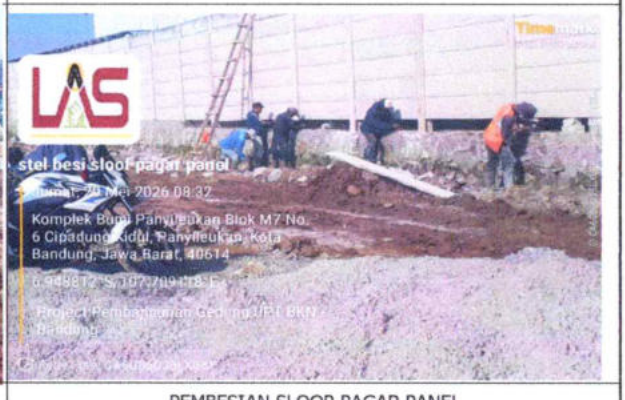

PEMBESIAN SLOOP PAGAR PANEL



GALIAN PILECAP



BEKESTING KOLOM PEDESTAL



BEKESTING KOLOM PEDESTAL



BEKESTING KOLOM PEDESTAL

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 29/05/2026
Minggu ke	: 6 (Enam)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING KOLOM



SLOOF PAGAR PANEL




PEBRIKASI BESI



PENGUKURAN PILECAP




BEKESTING`PILECAP

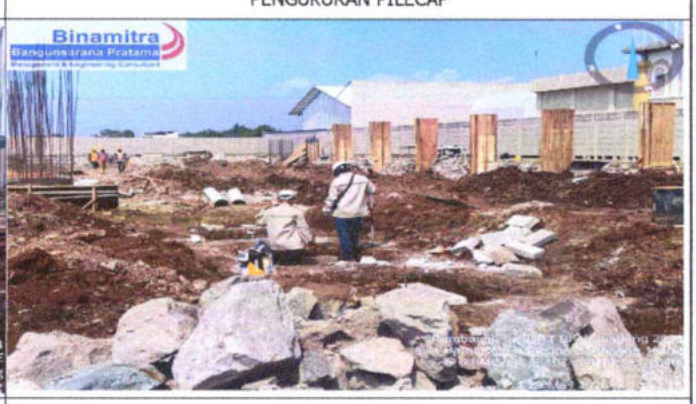

PASNGAN BATU



PEMBESIAN PILECAP

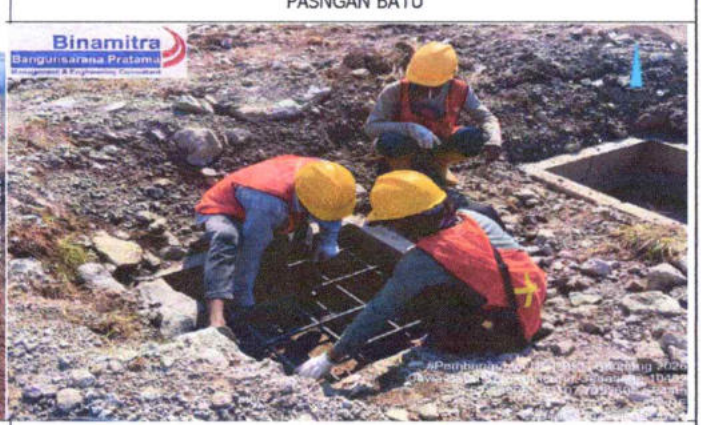

PEMBESIAN PILECAP

Hari	: Kamis
Tanggal	: 28/05/2026
Minggu ke	: 6 (Enam)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING KOLOM



SLOOF PAGAR PANEL

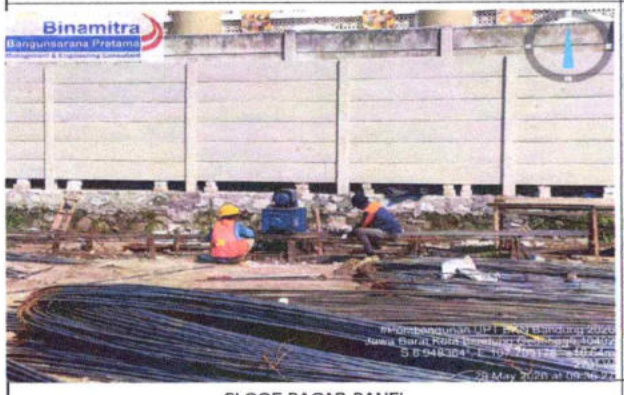

SLOOF PAGAR PANEL



PEMASANGAN PAGAR PANEL




BEKESTING



BEKESTING KOLOM



COR PILECAP

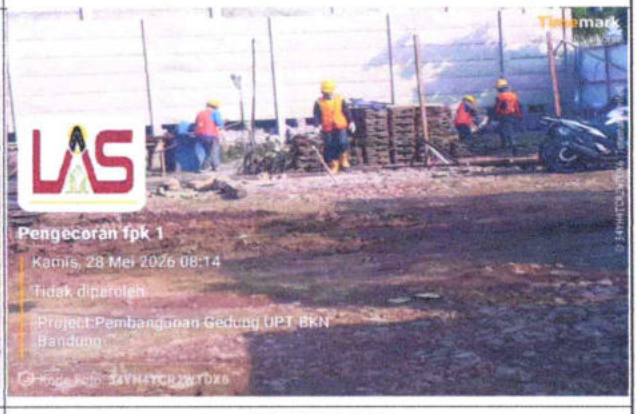

PEBRIKASI BESI

Binamitra Bangunsarana Pratama

Hari	: Rabu
Tanggal	: 27/05/2026
Minggu ke	: 6 (Enam)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN PILECAP



PEMBESIAN PILECAP



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PASANGAN HEBEL PONDASI PILECAP

Hari	: Selasa
Tanggal	: 26/05/2026
Minggu ke	: 6 (Enam)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBESIAN PILECAP



PEBRIKASI BESI



BEKESTING KOLOM



SLUMP TES



BEKESTING KOLOM



BEKESTING KOLOM



PENGECORAN PILECAP



PEMBESIAN KOLOM


Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

Hari : Senin
Tanggal : 25/05/2026
Minggu ke : 6 (Enam)

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING

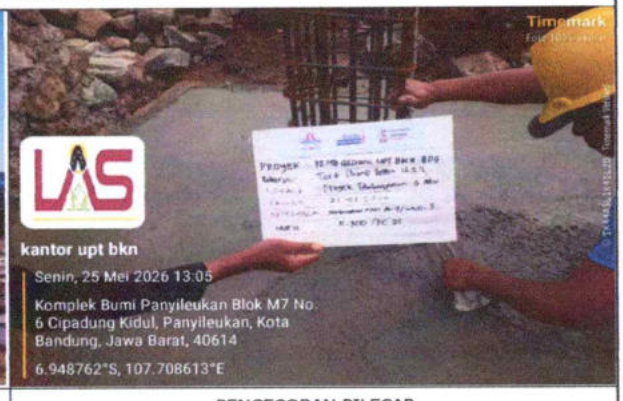

PENGECORAN PILECAP



PEMBESIAN PILECAP



PENGECORAN PILECAP



PENGECORAN PILECAP



PENGECORAN PILECAP



PENGECORAN PILECAP



PENGECORAN PILECAP

Hari : Minggu
Tanggal : 24/05/2026
Minggu ke : 5 (Lima)


Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING

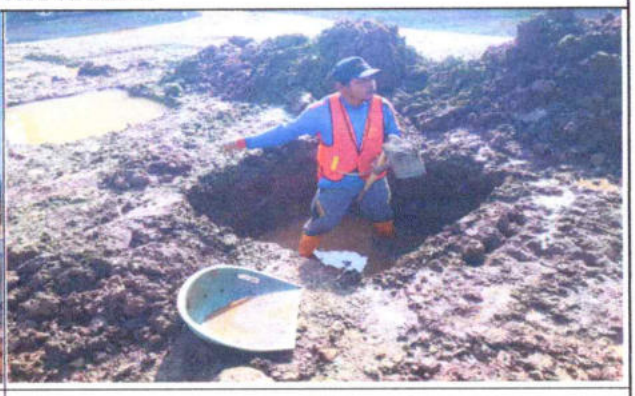


GALIAN PILECAP



PEBRIKASI BESI



PEMBESIAN PILECAP

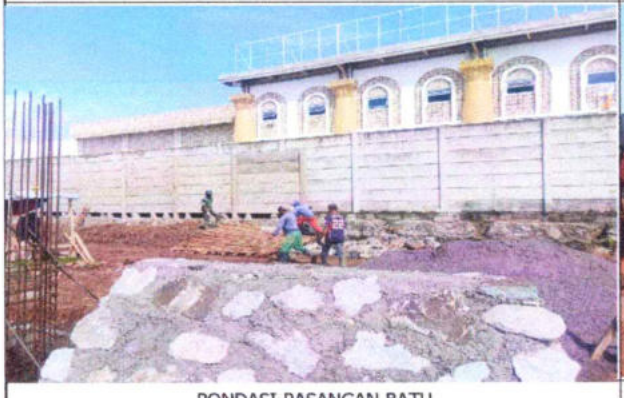

PONDASI PASANGAN BATU



PONDASI PASANGAN BATU



PEMBESIAN PILECAP



GALIAN PILECAP

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23/05/2026
Minggu ke	: 5 (Lima)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BOWPLANG PILECAP



PEBRIKASI BEKESTING



PEBRIKASI BEKESTING



PEBRIKASI BEKESTING KOLOM PEDESTAL



PONDASI PASANGAN BATU



PONDASI PASANGAN BATU



GALIAN PILECAP



GALIAN PILECAP

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 22/05/2026
Minggu ke	: 5 (Lima)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



PEMBESIAN KOLOM



GALIAN PONDASI PILECAP



GALIAN PONDASI PILECAP



PASANGAN BATU SLOOF PAGAR



BEKESTING KOLOM



BEKESTING PILECAP



BEKESTING PILECAP

Binamitra Bangunsarana Pratama	LAS	Hari : Kamis Tanggal : 21/05/2026 Minggu ke : 5 (Lima)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEBRIKASI PEMBESIAN



PEBRIKASI PEMBESIAN




PEMBESIAN FPK 1



PEMBESIAN FPK 1



PEMBESIAN SLOOF PAGAR

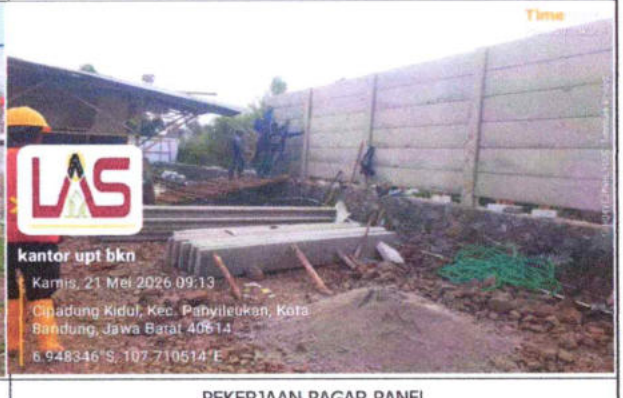

PEKERJAAN PAGAR PANEL



PONDASI PASANGAN BATU



PONDASI PASANGAN BATU

Hari	: Selasa
Tanggal	: 19/05/2026
Minggu ke	: 5 (Lima)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




PEMBESIAN PILECAP



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN PILECAP

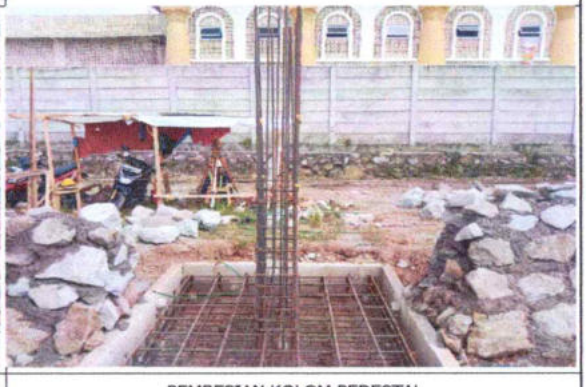

PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN PILECAP



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PONDASI PASANGAN BATU



PONDASI PASANGAN BATU

	Hari : Senin Tanggal : 18/05/2026 Minggu ke : 5 (Lima)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PAGAR PENGAMAN PROYEK



BARAK TENAGA



KANTOR DIREKSI KEET KONTAINER



KANTOR DIREKSI KEET KONTAINER



PEMBESIAN PILECAP



PEMBESIAN PILECAP



PONDASI PASANGAN BATU



PONDASI PASANGAN BATU

Hari	: Minggu
Tanggal	: 17/05/2026
Minggu ke	: 4 (Empat)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PAGAR SENG PENGAMAN PROYE



PAGAR SENG PENGAMAN PROYE



PEMBESIAN KOLOM PEDETAL



PEMBESISN PLE CAP



PONDASI PASANGAN BATU



PEMBESIAN KOLOM PEDETAL



PONDASI PASANGAN BATU



PONDASI PASANGAN BATU

	Hari : Sabtu Tanggal : 16/05/2026 Minggu ke : 4 (Empat)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



BEKESTING HEBEL PILECAP



BEKESTING HEBEL PILECAP



PEMBESIAN PILECAP



PEMBESIAN PILECAP



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEMBESIAN KOLOM PEDESTAL



PEBRIKASI BESI



PEBRIKASI BESI


Hari	: Jum'at
Tanggal	: 15/05/2026
Minggu ke	: 4 (Empat)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




LANTAI KERJA PILECAP

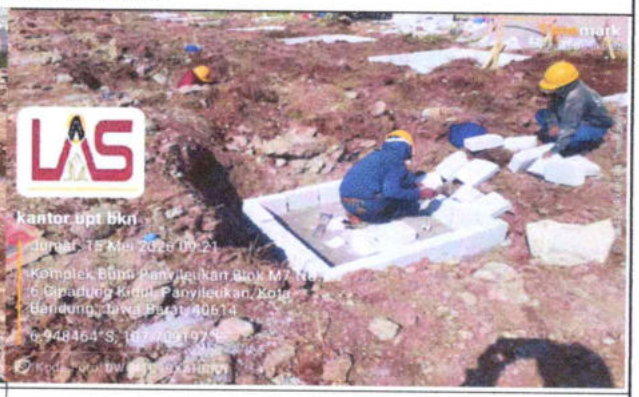

BEKESTING HEBEL PILECAP



BEKESTING HEBEL PILECAP

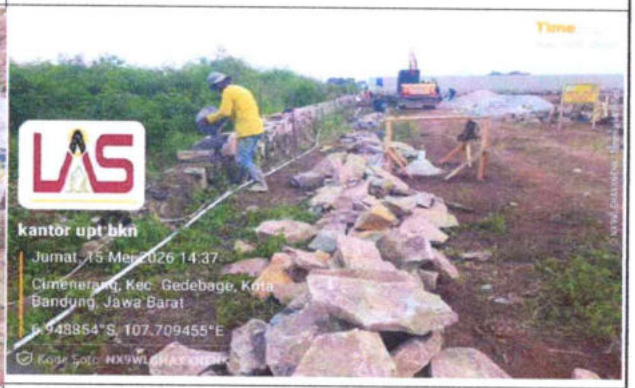

PASANGAN BATU



PASANGAN BATU



PASANG KOLOM PAGAR PANEL



GALIAN PILECAP



PEBRIKASI BESI

Hari	: Kamis
Tanggal	: 14/05/2026
Minggu ke	: 4 (Empat)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



GALIAN GWT



GALIAN GWT



LANTAI KERJA PILECAP



PEKERJAAN PASANG BEKESTING HEBEL PILECAP



PEKERJAAN PAGAR PANEL



PEKERJAAN PAGAR PANEL



PENGUKURAN BEKESTING PILECAP



PONDASI PASANGAN BATU PAGAR


Hari	: Rabu
Tanggal	: 13/05/2026
Minggu ke	: 4 (Empat)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEMBERSIHAN LAHAN

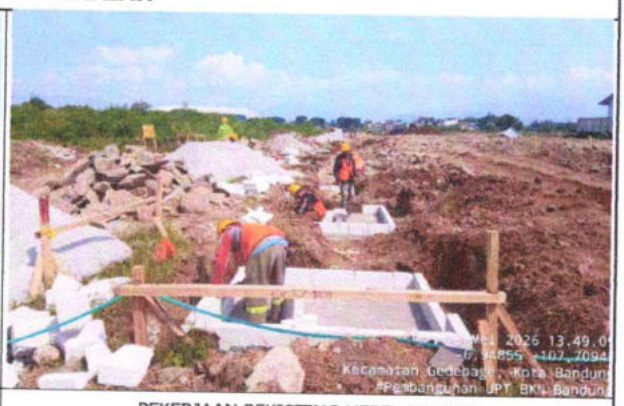

PEKERJAAN BEKISTING HEBEL PILECAP



PEKERJAAN LANTAI KERJA PILECAP




PEKERJAAN BEKISTING HEBEL PILECAP



PENGUKURAN LAHAN



PENGUKURAN LAHAN

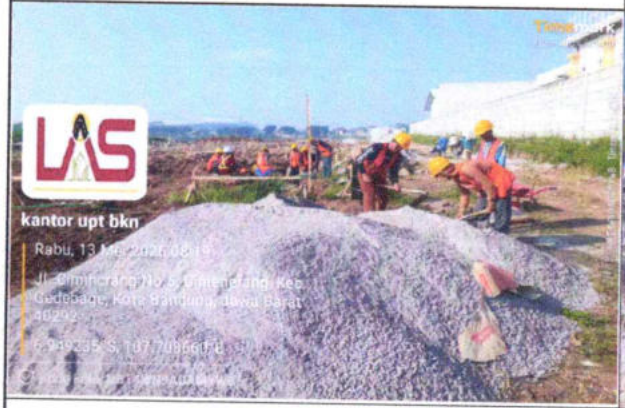

PASANGAN BATU PONDASI PAGAR PANEL



PASANGAN BATU PONDASI PAGAR PANEL

Hari	: Selasa
Tanggal	: 12/05/2026
Minggu ke	: 4 (Empat)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



RAPAT PEMBAHASAN PROGRES MINGGU KE 3



PAGAR PANEL



LANTA KERJA PILECAP



Pre construction meeting



PENINGGIAN PONDASI PASANGAN BATU



PEMASANGAN PIPA AIR KOTOR UNTUK KM



PEMBUATAN BARAK KERJA



PEMBUATAN KM PEKERJA

Hari	: Senin
Tanggal	: 11/05/2026
Minggu ke	: 4 (Empat)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PEKERJAAN STRIPING



PEKERJAAN PANEL



GALIAN PILECAP



GALIAN PILECAP



PEKERJAAN STRIPING



PEK BOWPLANG



PEMBUATAN MCK PEKERJA



FINISHING DIREKSI KEET

Hari	: Minggu
Tanggal	: 10/05/2026
Minggu ke	: 3 (Tiga)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



SAFETY MORNING



STRIPPING/ KUPAS TANAH



PERAPIHAN LANTAI DIREKSI KEET



PEMESANGAN PAGAR PANEL



GALIAN PILECAP



GALIAN TANAH PONDASI PASANGAN BATU



GALIAN PILECAP



PENINJAUAH PEK DIREKSI KEET

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 09/05/2026
Minggu ke	: 3 (Tiga)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



STRIPPING/ KUPAS TANAH




FINISHINF DIREKSI KEET



BARAK KERJA



PENGUKURAN

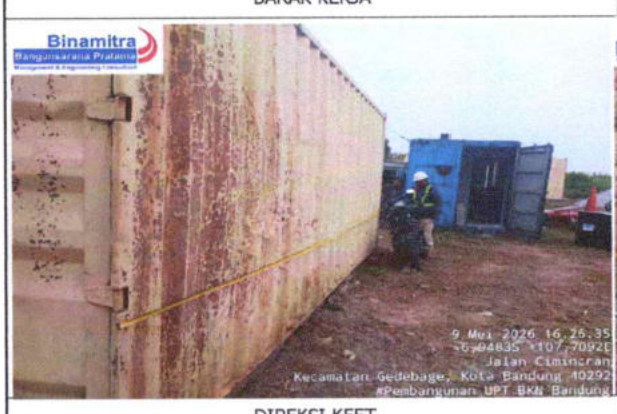

DIREKSI KEET



PEMADATAN GALIAN PILECAP



MATERIAL PSIR



PANEL PAGAR


Hari	: Jum,at
Tanggal	: 08/05/2026
Minggu ke	: 3 (Tiga)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



GALIAN PILECAP

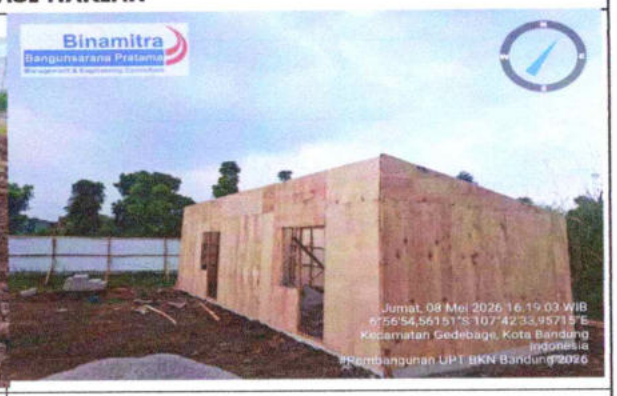

BARAK KERJA



BOWPLANG



BAR BANDER



MATERAIL UTKBARAK KERJA



AIR KERJA



PONDASI PASANGAN BATU



BEKESTING HEBEL

Hari	: Kamis
Tanggal	: 07/05/2026
Minggu ke	: 3 (Tiga)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



STRIPING



DIREKSI KEET




PEMBUATAN SUMUR



GALIAN PILECAP



GALIAN PILECAP

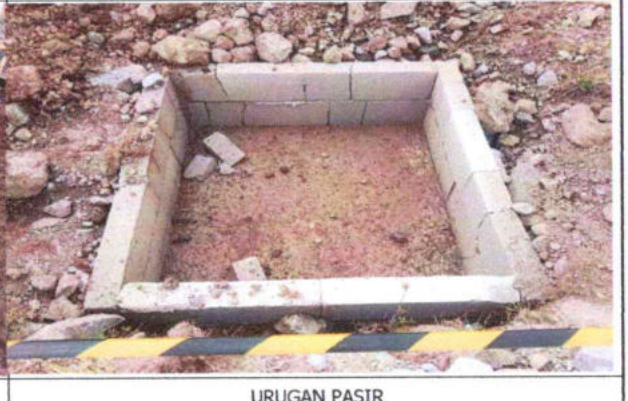

URUGAN PASIR



PONDASI HEBEL PILCAP



GALIAN PILECAP

Hari	: Rabu
Tanggal	: 06/05/2026
Minggu ke	: 3 (Tiga)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN




PAGAR PENGAMAN PROYEK




PAGAR PENGAMAN PROYEK



STRIPPING / PENGUPASAN LAHAN

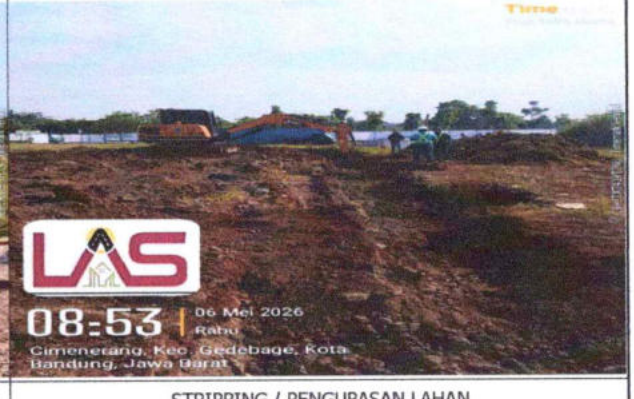

STRIPPING / PENGUPASAN LAHAN

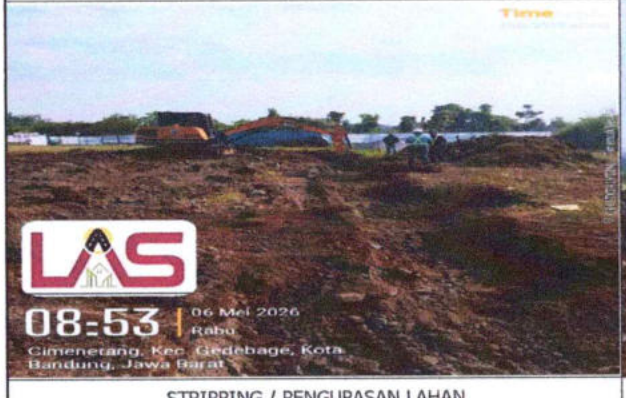

STRIPPING / PENGUPASAN LAHAN



STRIPPING / PENGUPASAN LAHAN



STRIPPING / PENGUPASAN LAHAN



SUMUR BOR

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

Hari : Selasa
Tanggal : 05/05/2026
Minggu ke : 3 (Tiga)

DOKUMENTASI HARIAN



PAGAR SEMENTARA



STRIPING



GALIAN PONDASI



STRIPPING/ KUPAS TANAH



MATERIAL PASIR



MATERIAL TRIPLEK UTK BARAK KERJA



RAPAT MINGGUAN



RAPAT MINGGUAN

	Hari : Minggu Tanggal : 03/05/2026 Minggu ke : 2 (Dua)

Pekerjaan : 134	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



EXSISTING



PENGUKURAN LAHAN



DUREKSI KEET



STRIPPING/ PENGUPASAN



STRIPPING/ PENGUPASAN



STRIPPING/ PENGUPASAN



STRIPPING/ PENGUPASAN



STRIPPING/ PENGUPASAN

Hari : Sabtu Tanggal : 02/05/2026 Minggu ke : 2 (Dua)	

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



PENGUKURAN LAHAN



STRIPPING / PENGUPASAN LAHAN



PEMBUATAN PAGAR PENGAMAN PROYEK



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING

	Hari : Jum,at Tanggal : 01/05/2026 Minggu ke : 2 (Dua)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



EXSISTING




EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING

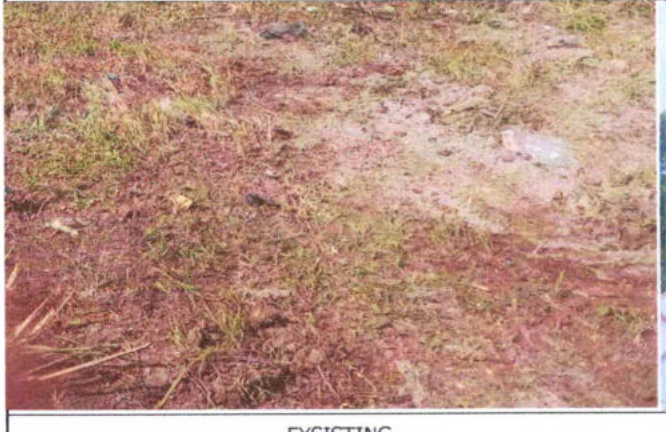

EXSISTING



PAGAR PROYEK

Hari	: Kamis
Tanggal	: 30/04/2026
Minggu ke	: 2 (Dua)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



EXSISTING



EXSISTING



MATERIAL UTK BARAK KERJA



STRIPING



FE. DIREKSI, PERENCANA,PENGAWAS, KONTRAKTOR



FE. DIREKSI, PERENCANA,PENGAWAS, KONTRAKTOR



FE. DIREKSI, PERENCANA,PENGAWAS, KONTRAKTOR




FE. DIREKSI, PERENCANA,PENGAWAS, KONTRAKTOR

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	29/04/2026
Minggu ke	:	2 (Dua)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung


DOKUMENTASI HARIAN

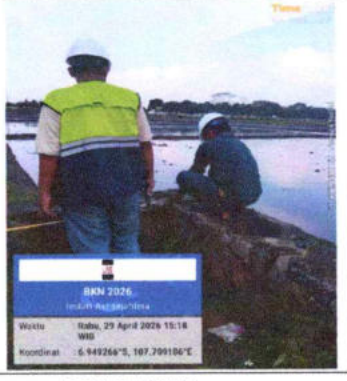

JOINT SURVEY




JOINT SURVEY

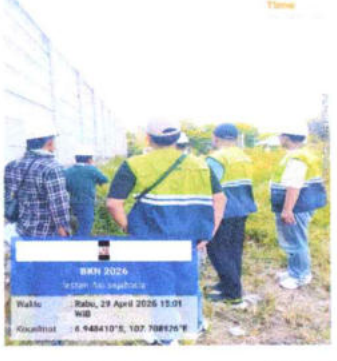


JOINT SURVEY



JOINT SURVEY

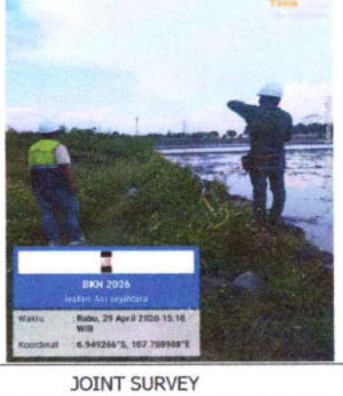

JOINT SURVEY

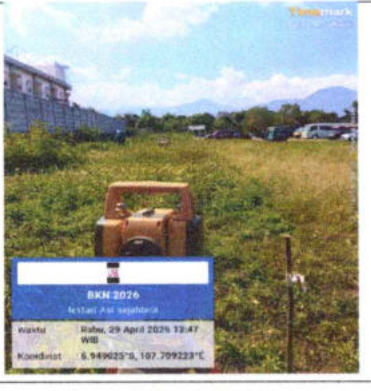

JOINT SURVEY



Pre construction meeting



Pre construction meeting

Hari : Selasa
Tanggal : 28/04/2026
Minggu ke : 2 (Dua)

Pekerjaan : Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

Kontraktor Pelaksana : PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas : PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja : Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



JOINT SURVEY



JOINT SURVEY



JOINT SURVEY



JOINT SURVEY

Hari	: Senin
Tanggal	: 27/04/2026
Minggu ke	: 2 (Dua)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



KOORDINASI DENGAN KELURAHAN CIMENERANG



KOORDINASI DENGAN KELURAHAN CIMENERANG



KOORDINASI DENGAN KELURAHAN CIMENERANG



KOORDINASI DENGAN KELURAHAN CIMENERANG



JOINT SURVEY



JOINT SURVEY



JOINT SURVEY



JOINT SURVEY

Hari	: Minggu
Tanggal	: 26/04/2026
Minggu ke	: 1 (Satu)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksana	: PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengawas	: PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



EXSISTING



EXSISTING



PEMBUTAN BARAK KERJA



MATERIAL KAYU KASAU



PEMBUATAN BARAK KERJA



EXSISTING



PENGADAAN MATERIAL BATU



PENGUKURAN

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 25/04/2026
Minggu ke	: 1 (Satu)

Pekerjaan	: Pembanguan Gedung BKN Bandung	Kontraktor Pelaksa :	PT Lestari Asi Sejahtera
NO. Kontrak	08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026	Konsultan Pengaw :	PT. Binamitra Bangunsarana Pratama
Lokasi	: Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Pemberi Kerja	: Dinas Kepegawaian Negara, Kantor Regional III Bandung

DOKUMENTASI HARIAN



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING



EXSISTING
